

# 三陸沿岸道路 山田宮古道路

復興道路

平成27年03月10日現在

## 工事状況のお知らせ vol.28



がんばろう！東北

東北地方整備局 三陸国道事務所



施工：④東急建設

写真は豊間根勝山地区です。JR山田線(休止中)を跨ぐ豊間根跨線橋の橋台が概ね完成しました。



施工：④東急建設【機械掘削】

豊間根トンネルの釜石側入口(豊間根勝山地区)の掘削状況です。掘削が340mまで進みました。



施工：⑩東京経済橋梁

写真は荒川地区です。荒川川に橋を架ける工事が契約となりました。よろしくお願いいたします。



施工：⑥植木組

写真は石峠地区です。土砂の搬出を進めています。ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いいたします。




施工：⑨大和小田急建設

写真は津軽石根井沢地区です。土砂の搬出作業を開始しました。よろしくお願いいたします。



施工：⑩本間組

写真は金浜地区です。水路樹(ます)のコンクリート打設を実施しています。

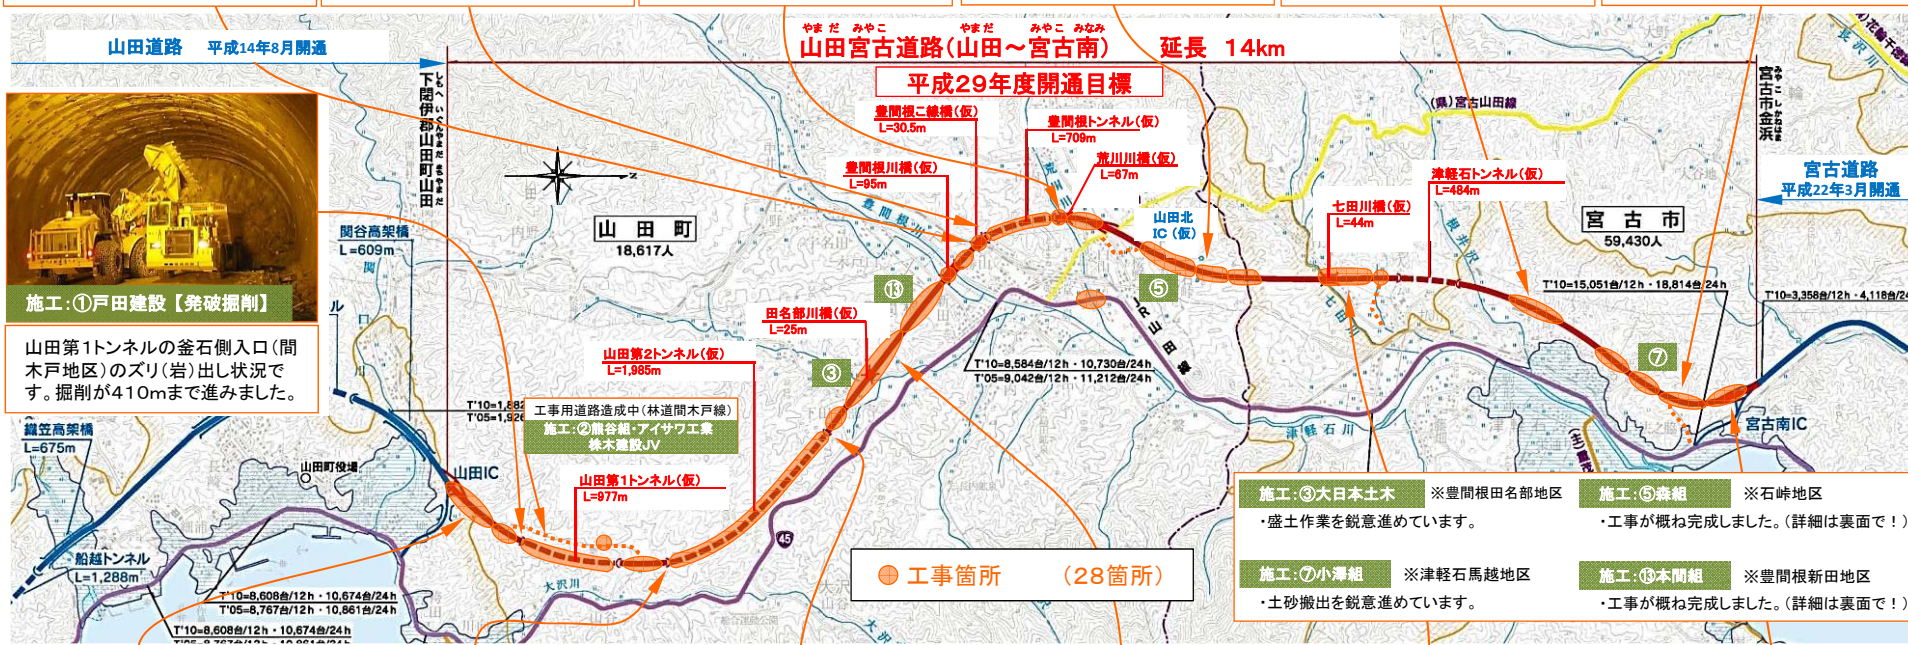

施工：①戸田建設【発破掘削】

山田第1トンネルの釜石側入口(間木戸地区)のズリ(岩)出し状況です。掘削が410mまで進みました。

- 施工：③大日本土木 ※豊間根田名部地区  
・盛土作業を鋭意進めています。
- 施工：⑤森組 ※石峠地区  
・工事が概ね完成しました。(詳細は裏面で！)
- 施工：⑦小澤組 ※津軽石馬越地区  
・土砂搬出を鋭意進めています。
- 施工：⑬本間組 ※豊間根新田地区  
・工事が概ね完成しました。(詳細は裏面で！)



施工：②熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV

写真は山田インターチェンジ予定地です。盛土作業が3段目に入りました。一番高いところで5段あります。



施工：②熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV【発破掘削】

山田第2トンネルの釜石側入口(大沢地区)です。掘削が370mまで進みました。



施工：②熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV【発破掘削】

山田第2トンネルの宮古側入口(豊間根田名部地区)の掘削状況です。掘削が360mまで進みました。



施工：⑭小原建設

写真は豊間根田名部～新田地区です。道路改良工事が契約となりました。よろしくお願いいたします。



施工：⑧奥村組

写真は津軽石荷竹地区です。表土を山田町織笠地区の圃場整備事業(岩手県)に搬出しています。



施工：⑪大和小田急建設

写真は宮古南インターチェンジ予定地(金浜地区)です。枝葉の集積作業を実施しています。

◆工事等一覧表 ※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

工事名	受注者	現場責任者	ダンプトラックの番号	問合せ先	工事期間
① 山田第1トンネル工事	戸田建設(株) 東北支店	音原、西脇	山田宮古道路 1	0193-77-4504	平成26年01月07日 ~ 平成28年02月下旬 予定
② 山田第2トンネル工事	農谷組・アイサワ工業・榎木建設JV	藤原、小西	山田宮古道路 2	0193-83-5735	平成26年11月26日 ~ 平成28年02月上旬 予定
③ 下田名部地区道路改良工事	大日本土木(株) 東北支店	橋村、伊藤	山田宮古道路 3	0193-83-5433	平成26年04月02日 ~ 平成27年03月下旬 予定
④ 豊間根トンネル工事	東急建設(株) 東北支店	安野、石澤	山田宮古道路 4	0193-83-5805	平成26年12月14日 ~ 平成27年11月中旬 予定
⑤ 石峠地区道路改良工事	(株)藤組 東北営業所	橋本、竹下	山田宮古道路 5	0193-86-3515	平成26年04月02日 ~ 平成27年03月31日 完成
⑥ 石峠改良工事	(株)榎木組 東北支店	今川、児玉	山田宮古道路 6	0193-77-4907	平成26年06月26日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑦ 津軽石北地区道路改良工事	(株)小澤組	佐々木、阿部	山田宮古道路 7	0193-67-9152	平成26年10月01日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑧ 津軽石道路工事	(株)興村組 東北支店	佐藤、高柳	山田宮古道路 8	0193-77-4197	平成26年11月01日 ~ 平成28年11月下旬 予定

工事名	受注者	現場責任者	ダンプトラックの番号	問合せ先	工事期間
⑨ 横井沢地区改良工事	大和小田急建設(株) 東北支店	加古、佐藤	山田宮古道路 9	0193-77-5785	平成26年08月29日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑩ 金浜南地区道路改良工事	(株)本間組 東北支店	長井、佐々木	山田宮古道路 10	0193-77-4723	平成26年07月30日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑪ 金浜北地区改良工事	大和小田急建設(株) 東北支店	飛高、西村	山田宮古道路 11	0193-77-5851	平成26年09月20日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑫ 山田北道路改良工事	西松建設(株) 東北支店	五十嵐、杉山	山田宮古道路 12	次号でお知らせいたします。	平成27年02月06日 ~ 平成29年02月下旬 予定
⑬ 豊間根地区道路改良工事	(株)本間組 東北支店	早川、萩原	---	0193-86-2240	平成26年04月02日 ~ 平成27年03月31日 完成
⑭ 豊間根川橋上部工事	(株)東京鐵骨構架 仙台営業所	高木	---	次号でお知らせいたします。	平成27年02月17日 ~ 平成27年10月上旬 予定
⑮ 豊間根南地区道路改良工事	(株)小原建設	平賀	---	次号でお知らせいたします。	平成27年04月02日 ~ 平成27年10月中旬 予定
⑯ 荒川川橋上部工事	(株)東京鐵骨構架 仙台営業所	高木	---	次号でお知らせいたします。	平成27年03月07日 ~ 平成28年02月中旬 予定



☆石峠地区道路改良工事が終了しました。  
(施工担当：森組)



山田町石峠地区で実施していました石峠地区道路改良工事が概ね終了しました。主な工事内容は、土砂掘削及び運搬(約5万m<sup>3</sup>)、法面工、BOX加幅(ト)3基)の設置等です。ダンプトラック運搬では通学路を通行することから、津軽石弘川地区で民生・児童委員の方と一緒に安全パトロールも実施しました。



◆他に協力いただいた皆さん

- 土工事・・・(株)河野建設、北陸実業建設(株)、(有)富士鉱業所、(株)金子技研
- BOX加幅(ト)工事・・・昭和ワカイト工業(株)、(株)千南工業
- 防水工事・・・リ-ポ-ド エム(株)、(株)利久工業
- 法面工事・・・丹内建設(株) ○測量・・・北村技術(株)
- ワカイト工事・・・(有)三東 ○交通誘導・・・桜心警備保障(株) ほか



▲定期的に町道清掃を実施しました



工事責任者 榎木さん

山田町石峠地区にて昨年の7月より本格的に工事を開始しましたが、3月末に竣工を迎えることとなりました。工事は土砂運搬が主体でしたので、大型ダンプの通行により沿道となる石峠・荷竹・弘川地区の皆様及び関係者各位には大変ご迷惑をお掛けしましたが、多大なるご理解とご協力により、無事に工事を終えることができました。最後に、復興の一端を担えたことを感謝するとともに、三陸沿岸道路が無事に全面開通をすること、ならびに東北の一日も早い復興を心より祈念いたします。



西岡さん(大阪府) 榎木さん(兵庫県) 竹下さん(大阪府)  
林さん(京都府) 仲山さん(新潟県)



☆豊間根地区道路改良工事が終了しました。  
(施工担当：本間組)



山田町豊間根新田地区で実施していました豊間根地区道路改良工事が概ね終了しました。主な工事内容は、土砂掘削(約17万m<sup>3</sup>)及び盛土工事(約14万m<sup>3</sup>)、法面工、排水構造物工事です。隣接している豊間根地区圃場整備事業と調整を図りながら工事を進めて参りました。




▲現場見学会(豊間根小学校)



▲山を削って盛土を行いました



施工前(H25.10月撮影)



施工後(H27.3月撮影)



工事責任者 早川さん

前回工事から引き続き去年の4月に工事を開始し、この3月末で工事を完了することとなりました。今回の工事は山から土砂を運搬し、道路の高さまで盛り上げる工事でした。幸いな事に、工事区域内での土砂の運搬であったため、一般道での大型車両通行は最小限とすることができ、地元の方々からのご理解を得て無事に工事を完了するに至り感謝いたしております。豊間根小学校、中学校の生徒さんの見学会により建設機械や工事内容について理解していただいたと考えております。最後にこれから続く三陸復興工事の無事故・無災害で事業を終えられるよう願っております。



早川さん(新潟県) 竹山さん(青森県) 萩原さん(新潟県)

◆他に協力いただいた皆さん

- 土工事・・・山崎建設(株)、(株)ゆかり
- 法面工事・・・丹内建設(株)
- 擁壁工事・・・(株)金丸組
- 舗装工事・・・三好建設(株)
- 水道工事・・・(有)斎藤設備
- 測量・・・北村技術(株)
- 排水構造物工事・・・(株)新和組、行方土建 ほか



▲早川さん撮影

現在、工事が全面展開しています。皆様にはご不便をお掛けいたしますが、平成29年度の開通を目標に進めてまいります。工事へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。



ご意見・ご感想をお寄せください。  
現場見学会の申し込みも待ってますよ!

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、下記の電話番号にご連絡ください。  
国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木  
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 TEL0193-71-1745  
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>



発行：山田宮古道路安全連絡協議会  
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP山田宮古)  
編集・監修：三陸国道事務所 建設監督官
