

三陸沿岸道路 山田宮古道路

復興道路

平成27年05月29日現在

工事状況のお知らせ vol.31



がんばろう！東北

東北地方整備局 三陸国道事務所



施工:③大日本土木

写真は豊間根下田名部地区です。大日本土木さん担当分が完成いたしました。(詳細は裏面で！)



施工:④東急建設(機械掘削)

写真は豊間根トンネルの釜石側入口(豊間根勝山地区)です。掘削が490mまで進みました。



施工:⑥植木組

写真は豊間根荒川地区です。盛土作業を進めています。よろしく願っています。



調査:④根井沢穴IV遺跡

根井沢穴IV遺跡の調査が終了しました。小面積ながら、製鉄炉を伴う工房跡が4基も見つかりました。




施工:⑨大和小田急建設

写真は津軽石根井沢地区です。ボックスカルバートの設置が完了しました。土砂搬出作業は継続中です。



施工:⑩本間組

写真は金浜地区です。4基目のボックスカルバートを設置しています。

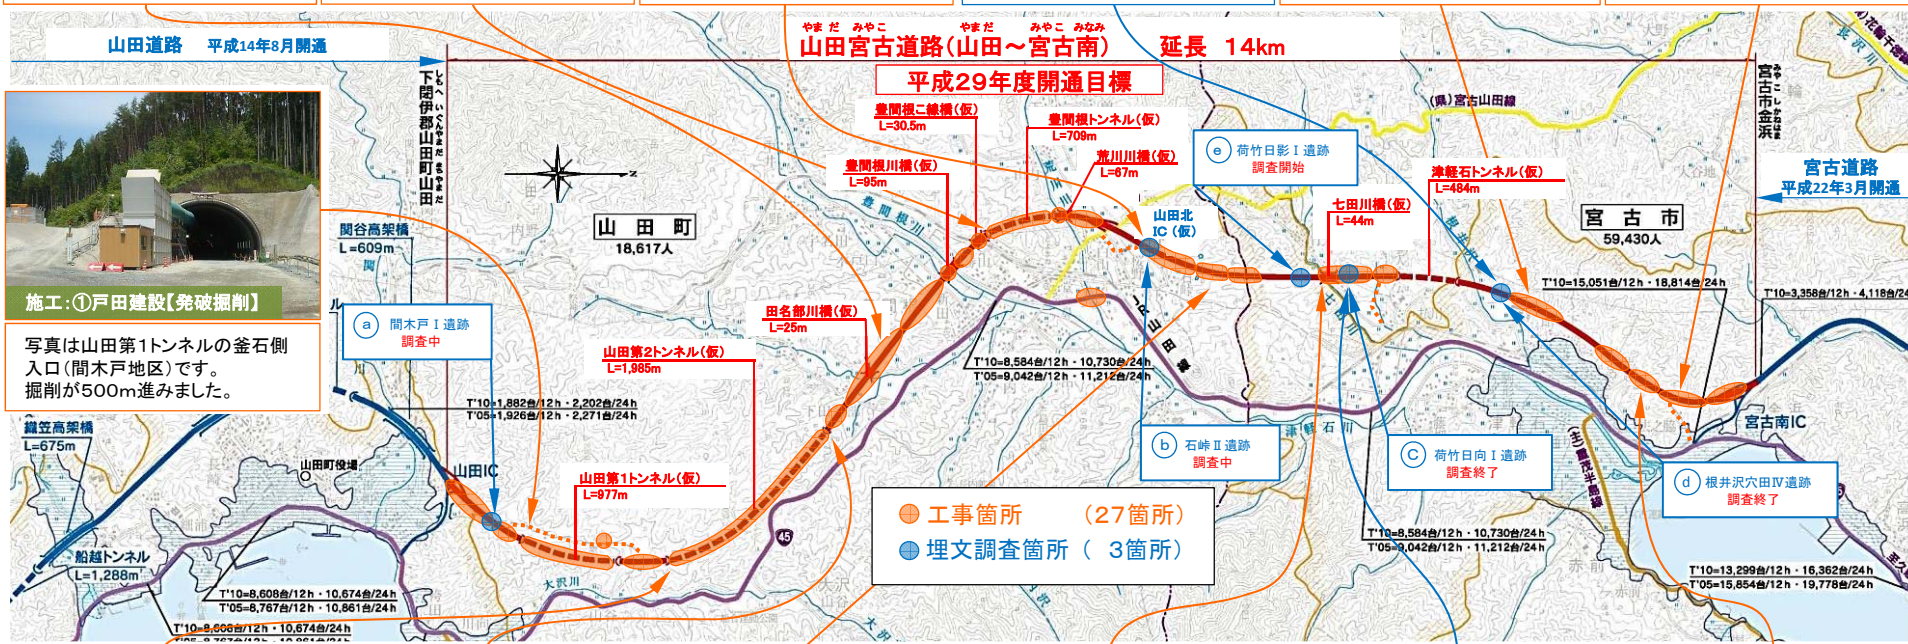

施工:①戸田建設【発破掘削】

写真は山田第1トンネルの釜石側入口(間木戸地区)です。掘削が500m進みました。



施工:②熊谷組・アイサワ工業 株木建設JV【発破掘削】

写真は山田第2トンネルの釜石側入口(大沢地区)です。掘削が460m進みました。



施工:②熊谷組・アイサワ工業 株木建設JV【発破掘削】

写真は山田第2トンネルの宮古側入口(豊間根下田名部地区)です。掘削が440m進みました。



施工:⑤西松建設 ⑥植木組

写真は石峠地区です。手前で植木組さんが土砂搬出、奥で西松建設さんが除根作業を実施しています。



施工:⑧奥村組

写真は津軽石荷竹地区です。七田川橋の杭打ち作業を開始いたします。よろしく願っています。



調査:③荷竹日向I遺跡

荷竹日向I遺跡の調査が終了しました。5棟の竪穴住居跡、5基の落とし穴等が確認されました。



施工:⑦小澤組

写真は津軽石馬越地区です。6月で土砂搬出作業(小澤組さん分)が終了予定です。

◆工事等一覧表 ※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

工事名	受注者	現場責任者	ダンブトラックの番号	問合せ先	工事期間
① 山田第1トンネル工事	戸田建設(株) 東北支店	菅原、西脇	山田宮古道路 1	0193 77-4504	平成26年01月07日 ~ 平成28年02月下旬 予定
② 山田第2トンネル工事	熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV	藤原、小西	山田宮古道路 2	0193 83-5735	平成25年11月26日 ~ 平成28年02月上旬 予定
③ 下田名部地区道路改良工事	大日本土木(株) 東北支店	植村、伊藤	山田宮古道路 3	0193 83-5433	平成26年04月02日 ~ 平成27年05月下旬 予定
④ 豊間根トンネル工事	東急建設(株) 東北支店	安野、石澤	山田宮古道路 4	0193 83-5805	平成25年12月14日 ~ 平成27年11月中旬 予定
⑤ 山田北道路改良工事	西松建設(株) 東北支店	五十嵐、杉山	山田宮古道路 5	0193 86-3200	平成27年02月06日 ~ 平成28年02月下旬 予定
⑥ 石峠改良工事	(株)植木組 東北支店	今川、児玉	山田宮古道路 6	0193 77-4907	平成26年06月26日 ~ 平成27年06月中旬 予定
⑦ 津軽石北地区道路改良工事	(株)小澤組	佐々木、阿部	山田宮古道路 7	0193 67-9152	平成26年10月01日 ~ 平成27年07月下旬 予定

工事名	受注者	現場責任者	ダンブトラックの番号	問合せ先	工事期間
⑧ 津軽石道路工事	(株)奥村組 東北支店	佐藤、高柳	山田宮古道路 8	0193 77-4197	平成26年11月01日 ~ 平成28年11月下旬 予定
⑨ 横井沢地区改良工事	大和小田急建設(株) 東北支店	加古、佐藤	山田宮古道路 9	0193 77-5785	平成26年08月29日 ~ 平成27年10月下旬 予定
⑩ 金浜南地区道路改良工事	(株)本間組 東北支店	長井、佐々木	山田宮古道路 10	0193 77-4723	平成26年07月30日 ~ 平成27年09月下旬 予定
⑪ 金浜北地区改良工事	大和小田急建設(株) 東北支店	飛高、西村	山田宮古道路 11	0193 77-5851	平成26年09月20日 ~ 平成27年12月下旬 予定
⑫ 豊間根横上郷土工事	(株)東京建設 仙台営業所	高木、松田	—	022 223-9088	平成27年02月17日 ~ 平成27年10月上旬 予定
⑬ 豊間根南地区道路改良工事	(株)小原建設	平賀、鈴木	—	0193 83-5005	平成27年04月02日 ~ 平成27年10月中旬 予定
⑭ 荒川川横上郷土工事	(株)東京建設 仙台営業所	高木	—	022 223-9088	平成27年03月07日 ~ 平成28年02月中旬 予定



☆下田名部地区道路改良工事が終了しました。
(施工担当：大日本土木)



山田町豊間根下田名部地区で実施していました下田名部地区道路改良工事が概ね終了しました。主な工事内容は、土砂掘削(約12万m³)及び盛土(約9万m³)、法面工、BOX加幅(1基)、仮橋の設置等です。工事区間周辺の清掃活動を定期的に行い、地域から長年の要望がありました、町道田名部新田線の舗装も行いました。



- ◆他に協力いただいた皆さん
 ○土工事・排水工事…(株)小川建設、(株)金山
 ○BOX加幅工事…昭和コンクリート工業(株)
 ○地盤改良・法面工事…がまが ラク(株)
 ○舗装工事…(株)石井建設
 ○仮設工事…ゼエス(株) ○測量…北村技術(株)



▲地域要望で町道の舗装を実施しました



工事責任者
植村さん

山田町豊間根地区で工事を開始し、14か月の月日を経て5月末で完了する事となりました。主な工事は山を掘削した土砂を30t及び10tダンブで運搬し、盛土する工事です。早朝から夕方まで大きな機械で作業する中、近隣の皆様方のご理解とご協力をいただき、事故もなく無事竣工をむかえる事ができたことに、心より感謝いたします。また、「がんばろう!東北」にわずかばかりでも携わることができ、誇りに思います。最後に、三陸沿岸道路の一日も早い開通及び東北の復興を祈念いたします。



安全掲示板 安全はすべてに優先する
 下田名部地区道路改良工事 大日本土木株式会社
 道内さん(岡山県) 伊藤さん(愛知県) 植村さん(千葉県)
 赤塚さん(新潟県) 貴島さん(鹿児島県)



☆高浜小学校の6年生(9名)が工事状況の取材に訪れました!(担当:大和小田急建設)



総合的な学習の一環として、宮古市高浜地区の現在の様子を、岩手県内陸の人たちに伝えるパンフレットづくりに取り組んでいる高浜小学校の6年生(9名)が、5月15日(金)、金浜北地区改良工事(大和小田急建設)の現場事務所に取材に訪れました。

「どのくらい工事の期間があるのですか?」「どのような気持ちで働いているのですか?」等の質問に対し、工事責任者の西村さんが「工事期間は今年いっぱい予定です」「山田宮古道路が1日でも早く完成し、喜んでもらえるように取り組んでいます」と答えました。出来上がったパンフレットは、6月上旬の修学旅行時に宿泊客や観光客等に配布する予定です。



▲取材前のあいさつ



▲丁寧にわかりやすく説明しました



▲鋭い質問もたくさん出ました!



☆国道45号豊間根橋の通行が仮橋に切替わりました! 安全運転をお願いいたします。



国道45号の豊間根橋の通行が、5月25日(月)、仮橋に切り替わりました。今後は豊間根橋の撤去作業に入りますので、引き続きよろしくをお願いいたします。(施工担当:西松建設) スピードの出しすぎに注意し、安全運転の程よろしくをお願いいたします。



▲通行が仮橋に切り替わりました。



▲ゴールデンウィーク中は鯉のぼりが揚がりました

現在、工事が全面展開しています。皆様にはご不便をお掛けいたしますが、平成29年度の開通を目標に進めてまいります。工事へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。



ご意見・ご感想をお寄せください。

現場見学会の申し込みも待ってます!

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、下記の電話番号にご連絡ください。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木
 〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 TEL0193-71-1745
 ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>



発行：山田宮古道路安全連絡協議会
 三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP山田宮古)
 編集・監修：三陸国道事務所 建設監督官
