

三陸沿岸道路 山田宮古道路

復興道路

平成27年06月25日現在

工事状況のお知らせ vol.32



がんばろう！東北

東北地方整備局 三陸国道事務所



施工：①戸田建設

写真は豊間根下田名部地区です。
(仮称)田名部川橋(橋台2基)の躯体を立ち上げています。



施工：③小原建設

写真は豊間根下田名部地区です。
盛土作業を実施するため、水路の設置を行っています。



調査：②石峠II遺跡

写真中央の赤線内は、伏籠(ふせがめ)とよばれる深鉢を伏せて埋めたものが発見されました。



施工：⑨大和小田急建設

写真は津軽石根井沢地区です。
設置したBOXカルバートを埋戻して、盛土作業を実施しています。




実施：山田宮古道路安全連絡協議会

協議会では毎月道路環境整備を実施しています。今回は津軽石根井沢地区(国道45号)で草刈を行いました。



施工：⑩宮古地方森林組合

写真は津軽石馬越地区です。
BOXカルバートを設置するための、伐採作業を実施しました。

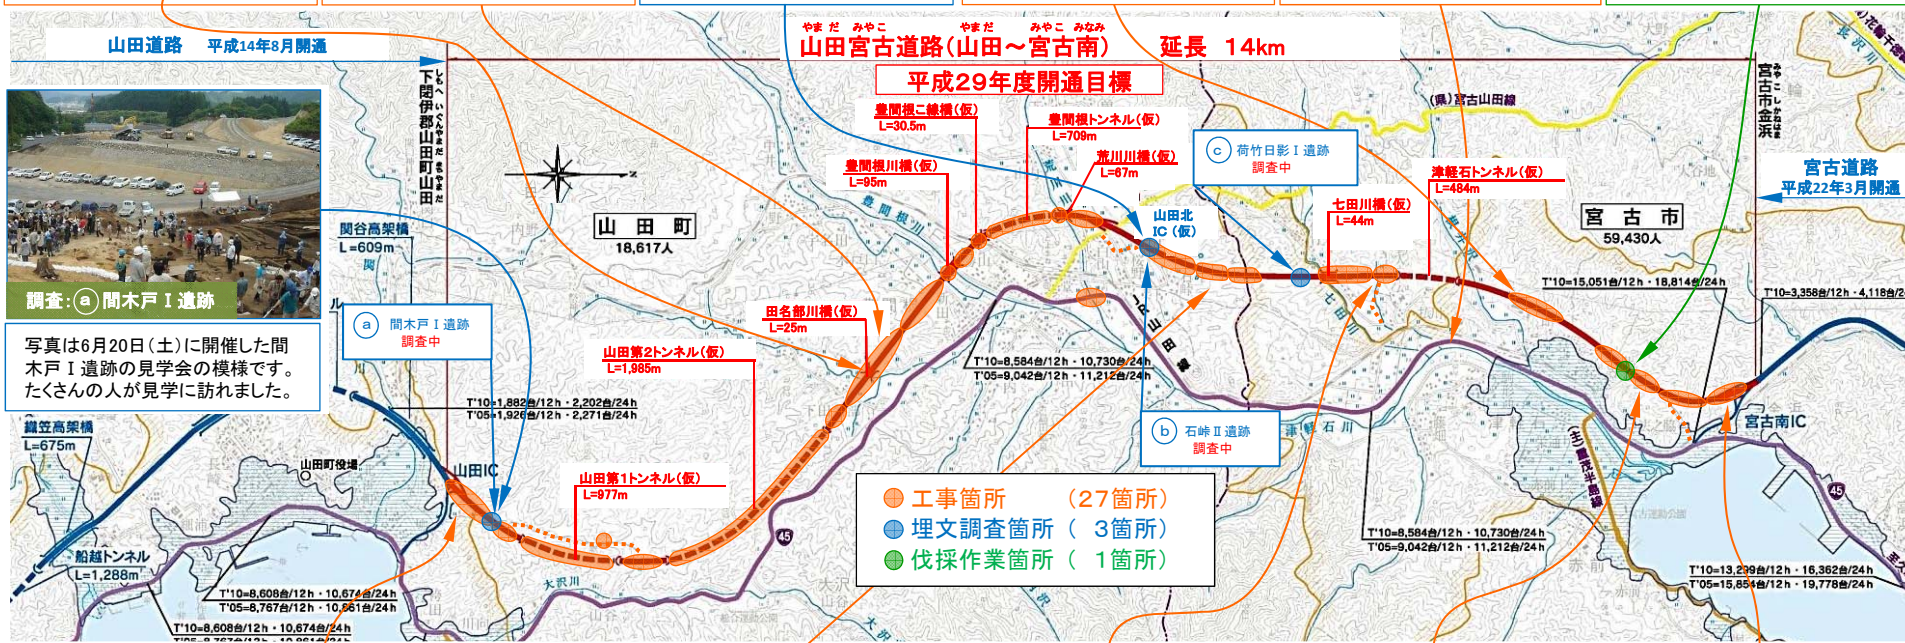

調査：⑤間木戸I遺跡

写真は6月20日(土)に開催した間木戸I遺跡の見学会の様です。たくさんの方が見学に訪れました。

- 工事箇所 (27箇所)
- 埋文調査箇所 (3箇所)
- 伐採作業箇所 (1箇所)



施工：②熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV

写真は山田IC(インターチェンジ)予定地です。(山田町山田地区)盛土作業を鋭意進めています。一番高いところで5段(約25m)立ち上がります。引き続き、ご協力よろしくお願いいたします。



施工：⑤西松建設

写真は石峠地区です。掘削及び土砂搬出を実施中です。よろしくお願いいたします。



施工：⑧奥村組

写真は津軽石根井沢地区です。盛土作業を進めています。奥では津軽石トンネルの施工が予定されています。



施工：⑦小澤組

写真は津軽石馬越地区です。土砂搬出作業が概ね終了し、法面の植生作業を実施しています。



施工：⑩大和小田急建設

写真は、宮古南IC(インターチェンジ)付近です。工事用道路の造作作業を実施しています。

◆工事一覧表 ※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

①	工事名	受注者	現場責任者	ダンプトラックの番号	問合せ先	工事期間
①	山田第1トンネル工事	戸田建設(株) 東北支店	菅原、西脇	山田宮古道路 1	0193 77-4504	平成26年01月07日 ~ 平成28年02月下旬 予定
②	山田第2トンネル工事	鹿谷組・アイザワ工業・株木建設JV	藤原、小西	山田宮古道路 2	0193 83-5735	平成25年11月26日 ~ 平成28年02月上旬 予定
③	豊間根南地区道路改良工事	(株)小原建設	平賀、鈴木	山田宮古道路 3	0193 83-5005	平成27年04月02日 ~ 平成27年10月中旬 予定
④	豊間根トンネル工事	東急建設(株) 東北支店	安野、石澤	山田宮古道路 4	0193 83-5805	平成25年12月14日 ~ 平成27年11月中旬 予定
⑤	山田北道路改良工事	西松建設(株) 東北支店	五十嵐、杉山	山田宮古道路 5	0193 86-3200	平成27年02月06日 ~ 平成29年02月下旬 予定
⑥	石峠改良工事	(株)株木組 東北支店	今川、児玉	山田宮古道路 6	0193 77-4907	平成26年06月26日 ~ 平成27年06月25日 完成
⑦	津軽石北地区道路改良工事	(株)小澤組	佐々木、阿部	山田宮古道路 7	0193 67-9152	平成26年10月01日 ~ 平成27年07月下旬 予定

⑧	工事名	受注者	現場責任者	ダンプトラックの番号	問合せ先	工事期間
⑧	津軽石道路工事	(株)奥村組 東北支店	佐藤、高柳	山田宮古道路 8	0193 77-4197	平成26年11月01日 ~ 平成28年11月下旬 予定
⑨	横井沢地区改良工事	大和小田急建設(株) 東北支店	加古、佐藤	山田宮古道路 9	0193 77-5785	平成26年08月29日 ~ 平成27年10月下旬 予定
⑩	金浜南地区道路改良工事	(株)本間組 東北支店	長井、佐々木	山田宮古道路 10	0193 77-4223	平成26年07月30日 ~ 平成27年09月下旬 予定
⑪	金浜北地区改良工事	大和小田急建設(株) 東北支店	飛高、西村	山田宮古道路 11	0193 77-5851	平成26年09月20日 ~ 平成27年12月下旬 予定
⑫	豊間根川橋上修工事	(株)東京鐵骨鋼梁 仙台営業所	高木、松田	—	022 223-9088	平成27年02月17日 ~ 平成27年10月上旬 予定
⑬	荒川川橋上修工事	(株)東京鐵骨鋼梁 仙台営業所	高木	—	022 223-9088	平成27年03月07日 ~ 平成28年02月中旬 予定
⑭	山田宮古地区伏拝作業	宮古地方森林組合	中居	—	0193 63-2173	平成26年05月19日 ~ 平成27年03月下旬 予定



☆石峠地区改良工事が終了しました。
(施工担当：植木組)



山田町豊間根～石峠地区及び宮古市津軽石払川地区で実施していました石峠地区改良工事が終了しました。主な工事内容は、土砂掘削(約7万m³)及び盛土(約2万m³)、法面工、工事用道路造成、BOX加幅(1基)の設置等です。ダンプトラックによる土砂運搬では通常路を通行することから、津軽石払川地区で民生・児童委員の方と一緒に交通街頭指導も行いました。



◀払川交差点で街頭指導を行いました。



森さん 児玉さん 今川さん 杉浦さん
※4名とも新潟県から復興支援に来ていただきました!

- ◆他に協力いただいた皆さん
- 土工事・排水工事…(株)カ/アル
 - 法面工事…日特建設(株)
 - BOX…昭和コンクリート工業(株)
 - 加幅工…(有)宏伸
 - 排水工事…松下技建(株)
 - 舗装工事…(株)ガ/ア/T-K
 - クレーン工事…(有)佐藤クレーン(株) 佐藤海事
 - 交通誘導…桜心警備保障(株) ほか



工事責任者
今川さん

山田町石峠地区にて昨年10月より工事を開始し、この7月で工事を完了することとなりました。工事は土砂運搬が主体でしたので、大型ダンプの通行により沿線である石峠、津軽石荷竹・払川地区の皆様及び、関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。無事に工事を終えることができたのも皆様の多大なるご理解とご協力あつてのものだと思っています。

最後に、復興道路(三陸沿岸道路)が無事故・無災害で終わられることを心から願います。



☆金浜地区の地域住民を対象に現場見学会を開催いたしました!(施工担当：本間組)



6月20日(土)に、宮古市金浜地区の地域住民を対象とした現場見学会を開催いたしました。当日は22名(うち小学生3名)の方が現場に訪れました。設置済みのカルポートBOXの中でテレビモニターを使用して工事の概要を説明し、その後にBOXの据付作業を見学いたしました。「現場の様子が間近で見れて良い経験になりました」「今回の現場以外でも、また参加したい」「一日も早い山田宮古道路の開通が待たれます」「クレーンがカッコイイと思った。将来僕も立派な運転手になりたい」といった多くの声が寄せられました。



▲BOX部材の吊上げ作業を見学しました



▲子供達も参加しました!



▲奥には宮古湾が望めます!



▲大型クレーンがバツに記念撮影しました

三陸国道事務所では、「山田宮古道路」等の工事見学を随時受け付けております。

お申し込み・お問い合わせ先：三陸国道事務所 総務課(地域づくり担当)
TEL：0193-71-1711 FAX：0193-71-1734
メールアドレス：sanriku@thr.mlit.go.jp
ホームページ：<http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>



現在、工事が全面展開しています。皆様にはご不便をお掛けいたしますが、平成29年度の開通を目標に進めてまいります。工事へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。



ご意見・ご感想をお寄せください。

現場見学会の申し込みも待ってます!

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、下記の電話番号にご連絡ください。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 TEL0193-71-1745
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>



発行：山田宮古道路安全連絡協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP山田宮古)
編集・監修：三陸国道事務所 建設監督官
