

# 三陸沿岸道路 山田宮古道路

復興道路

平成27年07月28日現在

## 工事状況のお知らせ vol.33



がんばろう！東北

東北地方整備局 三陸国道事務所



施工：②熊谷組・アイサワ工業 株木建設JV【発破掘削】

写真は山田第2トンネルの宮古側入口（豊間根下田名部地区）です。掘削が480mまで進みました。



施工：④東急建設【機械掘削】

写真は豊間根トンネルの釜石側入口（豊間根勝山地区）です。掘削が570mまで進みました。



調査：⑥石峠Ⅱ遺跡

写真は7月11日（土）に開催した石峠Ⅱ遺跡の見学会の様相です。108名の方が見学に訪れました。



施工：⑤西松建設

写真は石峠地区です。掘削及び土砂搬出を実施中です。よろしくお願いたします。




施工：⑧奥村組

写真は津軽石大森地区です。ボックスカルバート工事（現場打ち）を実施しております。



施工：⑩本間組

写真は金浜地区です。BOXカルバートの設置が終了し、盛土作業を実施しています。

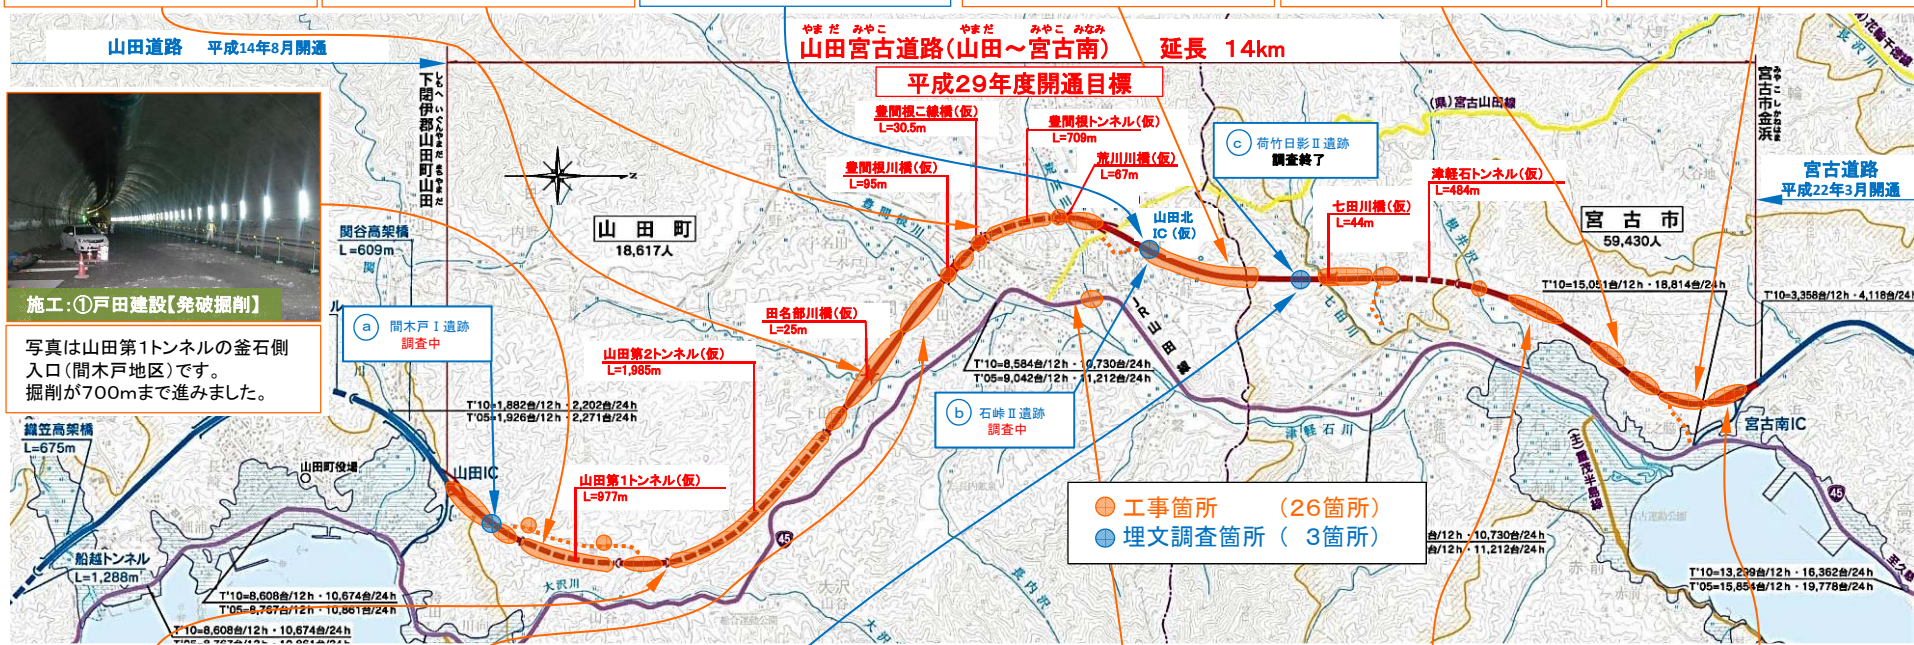

施工：①戸田建設【発破掘削】

写真は山田第1トンネルの釜石側入口（間木戸地区）です。掘削が700mまで進みました。



施工：②熊谷組・アイサワ工業 株木建設JV【発破掘削】

写真は山田第2トンネルの釜石側入口（大沢地区）です。掘削が620mまで進みました。



施工：③小原建設

写真は豊間根新田地区です。今後予定されているアスファルト舗装の下を、締め固めています。



調査：⑦荷竹日影Ⅱ遺跡

荷竹日影Ⅱ遺跡の調査が終了しました。斜面地に古代の堅穴住居跡9棟などが発見されました。



実施：山田宮古道路安全連絡協議会

写真は豊間根の「スーパーびはん」さんの敷地です。8月5日（水）にインフォメーションセンターがオープンします！



施工：⑨大和小田急建設

写真は津軽石根井沢地区です。ヒューム管（φ1.5m）の据付作業を実施しています。



施工：⑪大和小田急建設

写真は宮古南IC（インターチェンジ）付近です。掘削した土砂の搬出作業を実施しています。

◆工事一覧表 ※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

工事名	受注者	現場責任者	ダンプトラックの番号	問合せ先	工事期間
① 山田第1トンネル工事	戸田建設(株) 東北支店	菅原、西脇	山田宮古道路 1	0193-77-4504	平成26年01月07日 ~ 平成28年02月下旬 予定
② 山田第2トンネル工事	熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV	藤原、小西	山田宮古道路 2	0193-83-5735	平成25年11月26日 ~ 平成28年02月上旬 予定
③ 豊間根南地区道路改良工事	(株)小原建設	平賀、鈴木	山田宮古道路 3	0193-83-5905	平成27年04月02日 ~ 平成27年10月中旬 予定
④ 豊間根トンネル工事	東急建設(株) 東北支店	安野、筒井	山田宮古道路 4	0193-83-5805	平成25年12月14日 ~ 平成27年11月中旬 予定
⑤ 山田北道路改良工事	西松建設(株) 東北支店	五十嵐、杉山	山田宮古道路 5	0193-86-3200	平成27年02月06日 ~ 平成28年02月下旬 予定
⑥ 津軽石北地区道路改良工事	(株)小澤組	佐々木、阿部	山田宮古道路 7	0193-67-9152	平成26年10月01日 ~ 平成27年07月31日 完成
⑦ 津軽石道路工事	(株)奥村組 東北支店	佐藤、高柳	山田宮古道路 9	0193-77-4197	平成26年11月01日 ~ 平成28年11月下旬 予定

工事名	受注者	現場責任者	ダンプトラックの番号	問合せ先	工事期間
⑧ 横井沢地区改良工事	大和小田急建設(株) 東北支店	加古、佐藤	山田宮古道路 9	0193-77-5785	平成26年08月29日 ~ 平成27年10月下旬 予定
⑨ 金浜南地区道路改良工事	(株)本間組 東北支店	長井、佐々木	山田宮古道路 10	0193-77-4723	平成26年07月30日 ~ 平成27年09月下旬 予定
⑩ 金浜北地区改良工事	大和小田急建設(株) 東北支店	飛高、西村	山田宮古道路 11	0193-77-5851	平成26年09月20日 ~ 平成27年12月下旬 予定
⑪ 豊間根横川上部工事	(株)東京鐵骨構業 仙台営業所	高木、松田	—	022-223-9088	平成27年02月17日 ~ 平成27年10月上旬 予定
⑫ 荒川川橋上部工事	(株)東京鐵骨構業 仙台営業所	高木	—	022-223-9088	平成27年03月07日 ~ 平成28年02月中旬 予定
⑬ 山田宮古地区伐採作業	宮古地方森林組合	中居	—	0193-63-2173	平成26年05月19日 ~ 平成27年03月下旬 予定
⑭					

☆津軽石北地区道路改良工事が終了しました。  
(施工担当：小澤組)

宮古市津軽石馬越地区で実施していました、津軽石北地区道路改良工事が終了しました。主な工事内容は、土砂掘削(約7万m<sup>3</sup>)及び、法面工、工事用道路造成等です。工事が概ね終了した際には、今後の大雨や台風に備えて、津軽石川までつながる大型水路に溜まった土砂を、バキュームを使って除去しました。



▲大型水路の泥上げを実施しました

- ◆他に協力いただいた皆さん
- 土工事・排水工事 … 日記建設(株)、長良通商(株)、(株)佐藤解体、佐々木産業(株)
  - 法面工事 … (株)飛鳥、(株)二戸興業
  - 仮設工事 … ヤマキ縮業(株)
  - 交通誘導 … トータルセキュリティ(株) ほか



工事責任者 佐々木さん

津軽石馬越地区で工事を開始し、7月末で工事を完了することになりました。主な工事は山を掘削した土砂を10tダンプで運搬する工事です。早朝から夕方までダンプ運搬をする中、沿線住民及び関係者の皆様には多大なご迷惑をおかけしましたが皆様のご理解ご協力をいただき、事故もなく無事に竣工を迎えることができたことに心より感謝いたします。最後に三陸沿岸道路の1日も早い開通と安全を心から願います。



阿部さん(岩手県) 佐々木さん(岩手県)  
青木さん(栃木県) 佐々木さん(岩手県)

☆現場見学会を開催し、復興を実感していただきました!

○津軽石中学校3年生(41名) 平成27年7月10日(金)  
(施工担当：西松建設・東急建設)


7月10日(金)に、津軽石中学校の3年生(41名)及び教職員4名の皆さんが、総合学習の一環として、「山田北道路改良工事(西松建設)」及び、「豊間根トンネル工事(東急建設)」の現場を見学され、復興状況を体感していただきました。



▲工事の概要説明を真剣に聞いています。



▲トンネルの掘削状況を間近で体感!



▲工事現場をバックに記念撮影



▲トンネル入口をバックに記念撮影

三陸国道事務所では、「山田宮古道路」等の工事見学を随時受け付けております。

お申し込み・お問い合わせ先：三陸国道事務所 総務課(地域づくり担当)  
TEL:0193-71-1711 FAX:0193-71-1734  
メールアドレス: sanriku@thr.mlit.go.jp  
ホームページ: <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>



現在、工事が全面展開しています。皆様にはご不便をお掛けいたしますが、平成29年度の開通を目標に進めてまいります。工事へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。



ご意見・ご感想をお寄せください。  
現場見学会の申し込みも待ってますよ!

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、下記の電話番号にご連絡ください。  
国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木  
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 TEL0193-71-1745  
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>



発行：山田宮古道路安全連絡協議会  
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP山田宮古)  
編集・監修：三陸国道事務所 建設監督官
