

三陸沿岸道路 山田宮古道路

復興道路

平成28年2月25日現在

工事状況のお知らせ vol.42



がんばろう！東北

東北地方整備局 三陸国道事務所



施工：⑫東京鐵骨橋梁



施工：⑬オリエタル白石



施工：④東急建設



施工：⑥青木あすなろ建設



施工：⑧奥村組



施工：⑨松尾建設


写真は(仮称)豊間根川橋[左写真]と、(仮称)豊間根こ線橋[右写真]です。床部分のコンクリート打設が終わり、壁部分の鉄筋を組み立てております。3月の完成を目指し、鋭意作業を進めております。

写真は(仮称)荒川川橋です。橋台が概ね完成し、最後の仕上げを残すのみとなりました。

写真は津軽石荷竹地区です。掘削及び土砂搬出を実施中です。よろしくお願いたします。

写真は(仮称)七田川橋です。A2橋台の杭を設置する作業を実施中です。

写真は津軽石馬越地区です。道路改良工事が契約となりました。よろしくお願いたします。

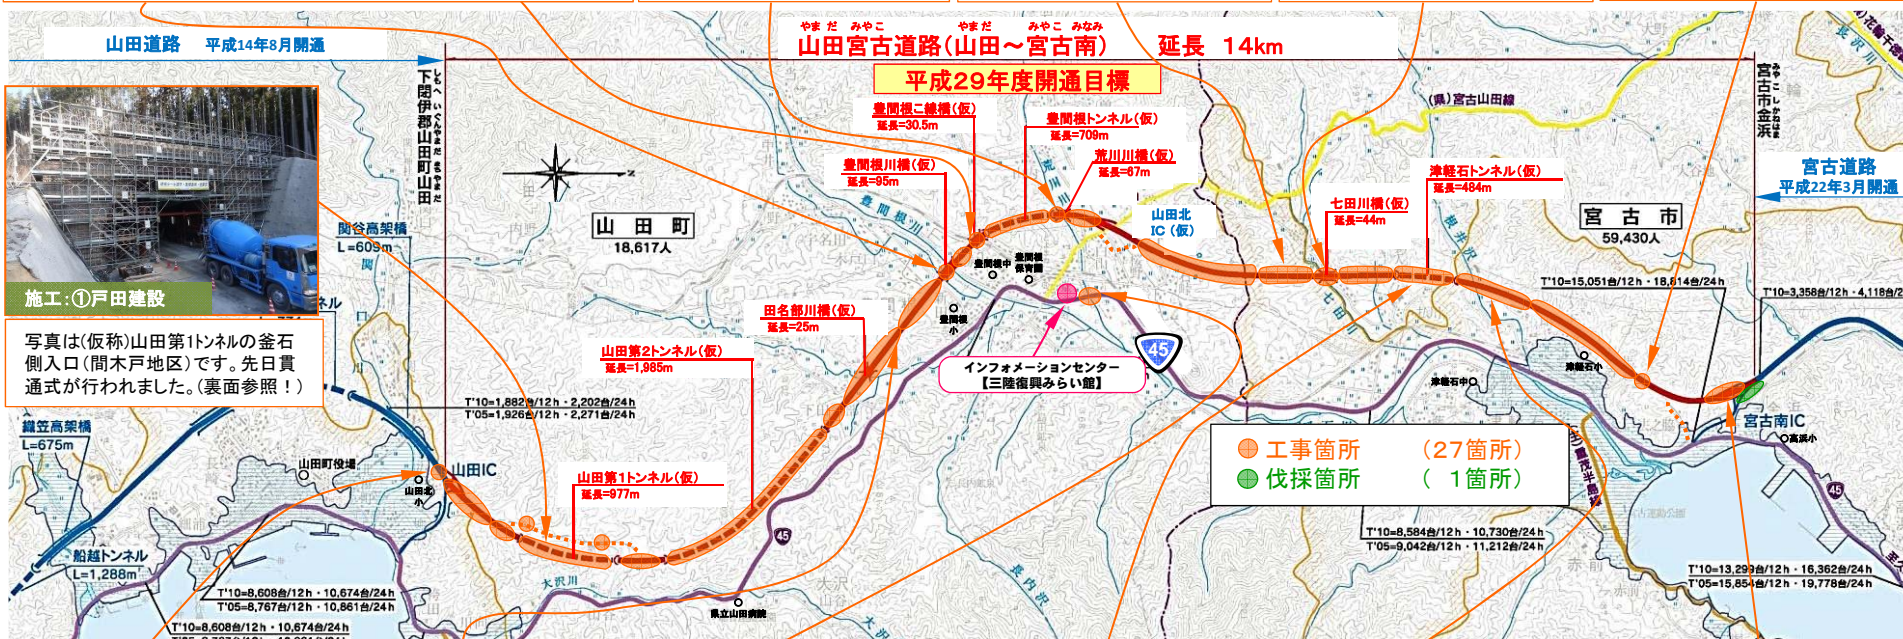

施工：①戸田建設

写真は(仮称)山田第1トンネルの釜石側入口(間木戸地区)です。先日貫通式が行われました。(裏面参照！)



施工：②熊谷組・アイサワ工業 株木建設Ⅳ



施工：③小原建設



施工：⑤西松建設



施工：⑧奥村組



施工：⑦森組



施工：⑩鴻池組

写真は山田IC(インターチェンジ)予定地です(山田町山田地区)。上部より掘削を開始しました。

写真は豊間根新田地区です。掘削した土砂は田名部・勝山地区で盛土材に使用されています。

写真は国道45号豊間根橋です。550tクレーンで撤去作業を実施しています。

写真は(仮称)津軽石トンネルです。発破による掘削を実施しています。よろしくお願いたします。

写真は津軽石根井沢地区[左写真]と宮古南IC(インターチェンジ)予定地[右写真]です。これから掘削及び土砂の搬出が始まります。ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いたします。

◆工事一覧表 ※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

工事名	受注者	現場責任者	ダンプトラックの番号	問合せ先	工事期間
① 山田第1トンネル工事	戸田建設(株) 東北支店	菅原、西脇	山田宮古道路 1	0193 77-4504	平成26年01月07日 ~ 平成28年07月下旬 予定
② 山田第2トンネル工事	熊谷組・アイサワ工業・株本建設JV	藤原、小西	山田宮古道路 2	0193 83-5735	平成25年11月26日 ~ 平成28年09月上旬 予定
③ 豊岡横根地区道路改良工事	(株)小原建設	平賀、鈴木	山田宮古道路 3	0193 83-5905	平成27年04月02日 ~ 平成28年03月下旬 予定
④ 豊岡横根トンネル工事	東急建設(株) 東北支店	安野、筒井	山田宮古道路 4	0193 83-5805	平成25年12月14日 ~ 平成28年03月下旬 予定
⑤ 山田北地区道路改良工事	西松建設(株) 東北支店	五十嵐、杉山	山田宮古道路 5	0193 86-3200	平成27年02月06日 ~ 平成28年02月下旬 予定
⑥ 青竹地区道路改良工事	青木あすなろ建設(株) 東北支店	古屋、木村	山田宮古道路 6	0193 65-8677	平成27年08月04日 ~ 平成28年10月上旬 予定
⑦ 宮古南地区道路改良工事	(株)森組 東北営業所	野中、西川	山田宮古道路 7	0193 67-4375	平成27年11月20日 ~ 平成28年06月上旬 予定

※⑭の「大和小田急建設」は、平成27年10月1日から『フジタ』に名称が変更になりました。

工事名	受注者	現場責任者	ダンプトラックの番号	問合せ先	工事期間
⑧ 津軽石道路工事	(株)奥村組 東北支店	佐藤、高柳	山田宮古道路 8	0193 77-4197	平成26年11月01日 ~ 平成28年11月下旬 予定
⑨ 金浜地区道路改良工事	松尾建設(株) 仙台支店	大坪、秋	山田宮古道路 9	0193 71-2210	平成28年01月27日 ~ 平成28年11月上旬 予定
⑩ 宮古地区道路改良工事	(株)堀池組 東北支店	谷村、翁長	山田宮古道路 10	0193 65-7830	平成27年10月22日 ~ 平成29年06月下旬 予定
⑪ 荒川橋上部工事	(株)東急建設(株) 仙台営業所	原田	山田宮古道路 11	050 1485-1754	平成27年03月07日 ~ 平成28年06月下旬 予定
⑫ 豊岡横根橋上部工事	(株)東急建設(株) 仙台営業所	上床、瀬尾	050 1485-1754	022 223-4691	平成27年02月17日 ~ 平成28年03月下旬 予定
⑬ 豊岡横根橋上部工事	オリエンタル白石(株) 東北支店	丸山、松橋	022 223-4691	0193 77-5851	平成27年08月07日 ~ 平成28年03月下旬 予定
⑭ 金浜北地区改良工事	(株)フジタ 東北支店	飛高、西村	0193 77-5851		平成26年09月20日 ~ 平成28年02月下旬 予定

☆山田第1トンネル貫通式を執り 行いました! (施工担当: 戸田建設)

2月2日(火)に、山田第1トンネル(延長977m)の「貫通式」を執り行いました。山田宮古道路の中で、2本目の(全4本中)トンネル貫通となります。施工会社である、戸田建設主催のもと、佐藤山田町長をはじめとする来賓、関係者約90名が出席しました。また、山田南小学校6年生による「虎舞」も披露されました。



▲貫通の儀



▲挨拶 (永井三陸国道事務所長)



▲祝辞 (佐藤山田町長)



▲関係者による「樽神興」&「饗開き」



▲山田南小学校による「虎舞」



▲万歳三唱




▲記念撮影

☆金浜北地区改良工事が概ね終了しました。 (施工担当: フジタ) ※旧大和小田急建設

宮古市金浜地区で実施していました金浜北地区改良工事が概ね終了しました。主な工事内容は、土砂掘削(約4万㎡)及び盛土(約1万㎡)、工事用道路造成、BOXカルバート(1基)の設置等です。工事以外でも、高浜小学校のグラウンド整備を実施したり、工事状況の取材を受けたりと交流を深め、児童から感謝状も頂きました。



岡本さん(神奈川県) 雷元さん(東京都) 西村さん(宮城県) 山川さん(東京都) 飛高さん(東京都) 森田さん(東京都)

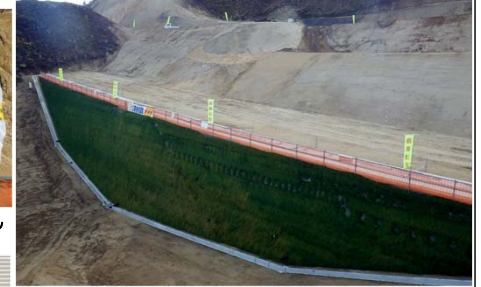

▲取材を受け、丁寧に説明しました。

▲頂いた「感謝状」

- ◆他に協力いただいた皆さん
- 土工事・構造物
 - ・排水工事・・・国土開発工業(株)
 - BOXカルバート工事・・・昭和コンクリート工業(株)
 - 目地・防水工事・・・スリポンドエコム(株)
 - ルー工事・・・(株)渡辺工業所
 - 交通誘導・・・(株)MKG ほか

宮古市金浜地区にて一昨年の9月より工事を開始し、2月末をもって工事を完了することになりました。工事は「宮古南インターチェンジ」となる場所に擁壁を作り、造成とカルバートボックスの据付を行いました。既に多くの復興事業が行なわれている中、当工事も進めさせていただくことになり、地域の皆様には大変ご負担をおかけいたしました。当初よりご理解・ご協力をいただきました地域の皆様に、心よりお礼申し上げます。工事期間中は地元の方々のご支援と、子供さんたちの元気な笑顔が大変励まされてまいりました。今後、三陸沿岸道路が開通し、復興・発展がより進みますよう、心から願っております。ありがとうございました。

工事責任者 西村さん

現在、工事が全面展開しています。皆様にはご不便をお掛けいたしますが、平成29年度の開通を目標に進めてまいります。工事へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。

ご意見・ご感想をお寄せください。
現場見学会の申し込みも待ってますよ!

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、下記の電話番号にご連絡ください。
国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 佐々木
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 TEL0193-71-1745
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>



発行：山田宮古道路安全連絡協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP山田宮古)
編集・監修：三陸国道事務所 建設監督官
