

三陸沿岸道路 山田宮古道路

復興道路

平成28年8月25日現在

工事状況のお知らせ vol.48



がんばろう！東北

東北地方整備局 三陸国道事務所




施工状況:全景 I (宮古方面望む)



施工:④東急建設

(仮称)豊間根トンネル終点部付近です。最終覆工コンクリート打設と坑口部、のり面施工を行っています。



施工:③小原建設

豊間根地区です。橋梁橋台背面部に軽量盛土工の施工を行っています。




施工:⑨松尾建設

馬越地区作業状況です。擁壁及び補強土壁施工前の掘削作業を行っています。



施工:⑩鴻池組

宮古南インターチェンジ作業状況です。大型重機による掘削作業(切土工事)及び土砂運搬を行っています。

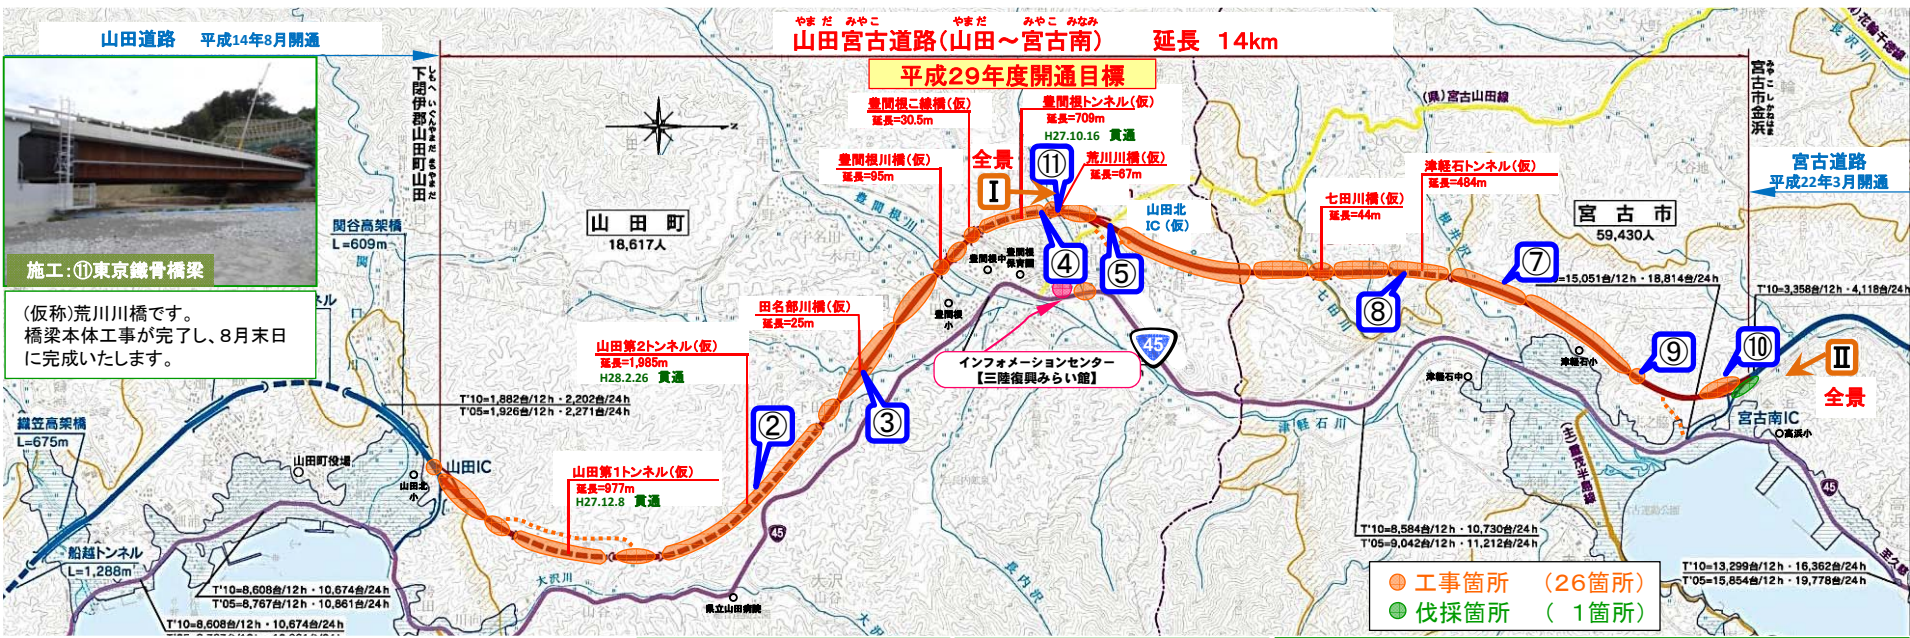

施工:⑪東京鐵骨橋梁

(仮称)荒川川橋です。橋梁本体工事が完了し、8月末日に完成いたします。



施工:②熊谷組・アイサワ工業 株木建設JV

(仮称)山田第2トンネル覆工コンクリート打設作業を行っています。打設作業は今月中に終了予定です。



施工:⑤西松建設

(仮称)山田北インターチェンジにボックスカルバートを設置するため鉄筋の組立作業を行っています。



施工:⑥奥村組

(仮称)七田川橋です。A2側橋台は鉄筋組立を終えて型枠設置作業を行っています。



施工:⑦森組

津軽石根井沢地区です。大型重機による掘削作業(切土工事)と土砂運搬を行っています。



施工状況:全景 II (山田方面望む)

◆工事等一覧表

※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

工事名	受注者	現場責任者	ダンプトラックの番号	問合せ先	工事期間
② 山田第2トンネル工事	熊谷組・アイザワ工業・株木建設JV	藤原、小西	山田宮古道路 2	0193 83-5735	平成25年11月26日 ~ 平成29年03月 予定
③ 豊岡横地区道路改良工事	(株)小原建設	齊藤、八重樫	山田宮古道路 3	0193 83-5905	平成28年03月31日 ~ 平成28年11月上旬 予定
④ 豊岡横トンネル工事	東急建設(株) 東北支店	簡井、安野	山田宮古道路 4	0193 83-5905	平成25年12月14日 ~ 平成29年03月 予定
⑤ 山田北道路改良工事	西松建設(株) 東北支店	五十嵐、杉山	山田宮古道路 5	0193 86-3200	平成27年02月06日 ~ 平成29年08月上旬 予定
⑥ 菅竹地区道路改良工事	青木あすなろ建設(株) 東北支店	古屋、木村	山田宮古道路 6	0193 65-8677	平成27年08月04日 ~ 平成28年12月 予定


工事名	受注者	現場責任者	ダンプトラックの番号	問合せ先	工事期間
⑦ 宮古南地区道路改良工事	(株)藤組 東北営業所	野中、西川	山田宮古道路 7	0193 67-4375	平成27年11月20日 ~ 平成29年06月上旬 予定
⑧ 津軽石道路工事	(株)興村組 東北支店	高柳、佐藤	山田宮古道路 8	0193 77-4197	平成26年11月01日 ~ 平成28年11月下旬 予定
⑨ 金浜地区道路改良工事	松尾建設(株) 仙台支店	大坪、秋	山田宮古道路 9	0193 71-2210	平成28年01月27日 ~ 平成28年11月上旬 予定
⑩ 宮古地区道路改良工事	(株)鴻池組 東北支店	谷村、翁長	山田宮古道路 10	0193 65-7830	平成27年10月22日 ~ 平成29年06月下旬 予定
⑪ 荒川川橋上部工事	(株)東京鐵骨橋梁 仙台営業所	原田、瀬尾	山田宮古道路 11	050 1485-1754	平成27年03月07日 ~ 平成28年08月下旬 予定



☆夏休み親子見学会を開催しました!完成間近の橋梁工事見学!
荒川小学校児童と父兄の皆様(42名) 平成28年8月4日(木)
荒川川橋上部工工事(施工担当:東京鐵骨橋梁)



8月4日(木)に、荒川小学校児童と父兄の皆様を対象とした夏休み親子現場見学会を開催しました。当日は42名の方が現場を訪れ、三陸道路の果たす役割をご理解いただきました。また、橋梁床版に記念メッセージ、寄せ書きや、大型クレーン模擬操作、高所作業車による乗車体験では高さを体感していただきました!



▲トンネルによる事業概要説明状況

▲橋梁床版上で記念撮影

▲高所作業車乗車体験による高さを体感!



▲大型クレーン車模擬操作体験!



▲床版上に、記念のメッセージや寄せ書き状況

◆記念のメッセージ、寄せ書きご紹介!!
★橋大好き!荒川川140周年おめでとう!
★楽しい記念になりました!!
★みなさん!!がんばってください!!
★ここを通るの楽しみ!!
★橋最高!!
★みなさん!!ありがとうございました!!



☆山田第1トンネル工事完成に先立ち、柳沢地区および山田第4仮設住宅の皆様をご招待し完成見学会を開催しました!
平成28年8月5日(金)(担当:戸田建設)



8月5日(金)に、山田第4仮設住宅及び柳沢地区の皆様を対象とした完成現場見学会を開催しました。当日は29名の方が現場を訪れました。工事記録写真やトンネル貫通時の映像等をトンネル壁面に映写し、完成のご報告をさせていただきました。『事故無く完成できて良かった!』『立派なトンネルだなあ!』と、皆様よりお声をいただきました。



◆事業の概要説明・工事記録写真展示状況。

◆記念撮影

◆工事記録映像等の映写状況



☆荒川川橋上部工工事が終了しました!
(施工担当:東京鐵骨橋梁)



工事責任者 原田さん

荒川地区にて今年の2月より工事を開始し、8月末をもって工事を完了することになりました。工事は「山田宮古道路」となる場所の一区間の橋梁工事を行いました。既に多くの復興事業が行われている中、当工事も進めさせていただくことになり、地域の皆様には大変ご負担をおかけいたしました。当初よりご理解・ご協力をいただきました地域の皆様に、心よりお礼申し上げます。工事期間中は地元の方々のご支援と、子供さんたちの元気な笑顔に大変励まされてまいりました。今後、三陸沿岸道路が開通し、復興・発展がより進みますよう、心から願っております。ありがとうございました。



瀬尾さん(岩崎) 原田さん(千塚) 有尾さん(鹿角島)

◆他に協力いただいた皆さん
○仮設工事... 俣佐藤組
○床版工事... 藤井建設機
○クレーン工事... 俣岡東重機(現:電材インテック)



☆各道路の一斉清掃を実施いたしました!(山田宮古道路安全連絡協議会)

山田宮古道路の工事施工者で構成する「山田宮古道路安全連絡協議会」による一斉清掃を平成28年8月2日(火)・5日(金)に実施しました。5社の約55名が参加し、歩道に堆積した土砂の撤去や雑草除去の清掃を実施しました。



▲林道山谷線 山田町大沢地区



▲市道 宮古市荷竹地区



▲三治道宮古南IC付近 宮古市

現在、工事が全面展開しています。皆様にはご不便をお掛けいたしますが、平成29年度の開通を目標に進めてまいります。工事へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。



お気付きの点がございましたらご意見・ご感想をお寄せください。

現場見学会の申し込みも待ってるよ!

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、下記の電話番号にご連絡ください。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 木村・三上
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 TEL0193-71-1745
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>



発行: 山田宮古道路安全連絡協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP山田宮古)
編集・監修: 三陸国道事務所 建設監督官
