

三陸沿岸道路 山田宮古道路

復興道路

平成29年2月27日現在

工事状況のお知らせ vol.54




がんばろう！東北

東北地方整備局 三陸国道事務所



<p>施工:① 柗佐藤渡辺</p>  <p>(仮称)山田第1トンネル内</p>	<p>施工:④ 東急建設</p>  <p>(仮称)豊間根トンネル起点部</p>	<p>施工:③ 小原建設</p>  <p>国道45号 豊間根橋地区</p>	<p>施工:⑬ 松尾建設</p>  <p>(仮称)田名部地区(田名部川橋終点側)</p>	<p>施工:⑨ 世紀東急工業</p>  <p>津軽石地区</p>	<p>施工:⑩ 柗鴻池組</p>  <p>宮古南インターチェンジ</p>
<p>大型敷均機械によるコンクリート舗装作業状況です。片側車線(L=977m)が終了し、現在養生中です。</p>	<p>豊間根トンネル電気室の外装作業が終了し、内装作業を行っています。</p>	<p>橋梁下部工は、橋台・橋脚部、土留鋼矢板の引抜作業を行っています。</p>	<p>背面部盛土施工状況。軽量コンクリートの打設・養生作業を行っています。</p>	<p>切土のり面に路面排水溝及び通信管路の設置作業状況です。</p>	<p>切土のり面の掘削作業を実施しています。</p>

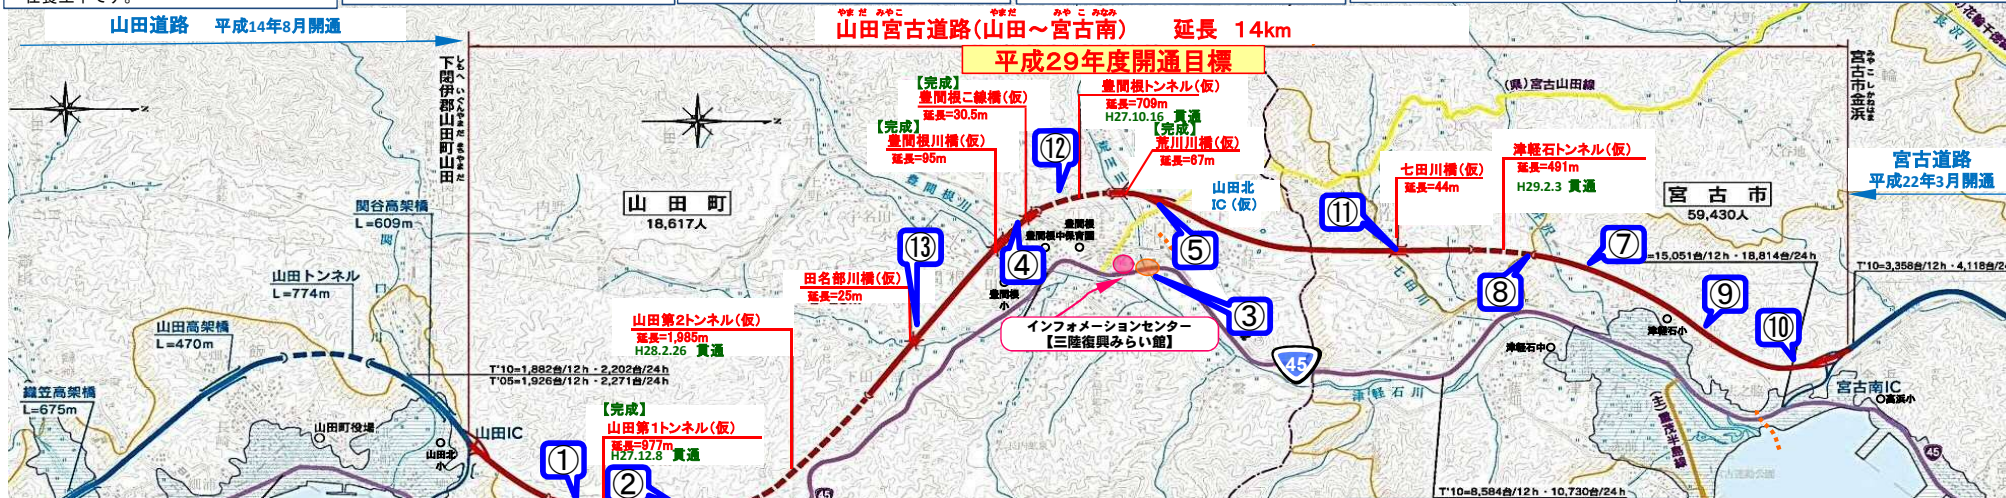

<p>施工:② 熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV</p>  <p>(仮称)山田第2トンネル起点部</p>	<p>施工:⑤ 西松建設</p>  <p>(仮称)山田北インターチェンジ付近</p>	<p>施工:⑧ 柗奥村組 (仮称)津軽石トンネル</p> 	<p>施工:⑦ 柗森組</p>  <p>津軽石根井沢地区</p>	<p>施工:⑪ オリエンタル白石</p>  <p>(仮称)七田川橋</p>	<p>施工:⑫ 常盤工業</p>  <p>(仮称)豊間根トンネル内</p>
<p>山田第1・第2トンネル電気室の外装塗装作業をしています。</p>	<p>大型機械による盛土作業を行っています。</p>	<p>終点部坑口付近です。地下水防水対策でトンネル内にシートを設置しています。</p>	<p>大型クレーンによるボックスカルバートの据付作業を行っています。</p>	<p>現在、架設に伴う準備作業中です。ワイヤーリフトの設置を完了し、架設桁の組み立て作業中です。</p>	<p>コンクリート舗装施工状況です。片側車線(L=709m)が終了し、現在養生中です。</p>

◆工事等一覧表 ※工事期間は、実作業ベースで記載しています。

工事名	受注者	現場責任者	ダンフトラックの番号	問合せ先	工事期間
① 山田地区舗装工事	(株)佐藤渡辺 東北支店	高宮、岩谷	山田宮古道路 1	0193-65-7535	平成28年10月8日 ~ 平成29年11月30日
② 山田第2トンネル工事	熊谷組・アイサワ工業・株木建設JV	藤原、小西	運搬終了	0193-83-5725	平成25年11月26日 ~ 平成29年3月24日
③ 豊間根地区道路改良工事	(株)小原建設	齊藤、八重樫	山田宮古道路 3	0193-83-5005	平成28年03月31日 ~ 平成29年3月24日
④ 豊間根トンネル工事	東急建設(株) 東北支店	筒井、安野	山田宮古道路 4	0193-83-5805	平成25年12月14日 ~ 平成29年3月24日
⑤ 山田北道路改良工事	西松建設(株) 東北支店	五十嵐、杉山	山田宮古道路 5	0193-86-3200	平成27年2月6日 ~ 平成29年8月上旬 予定
⑦ 宮古南地区道路改良工事	(株)森組 東北営業所	野中、西川	山田宮古道路 7	0193-67-4375	平成27年11月20日 ~ 平成29年6月12日

工事名	受注者	現場責任者	ダンフトラックの番号	問合せ先	工事期間
⑧ 津軽石道路工事	(株)奥村組 東北支店	高柳、佐藤	山田宮古道路 8	0193-77-4197	平成26年11月1日 ~ 平成29年7月28日
⑨ 宮古地区舗装工事	世紀東急工業(株) 東北支店	阪本、長井	山田宮古道路 9	0193-77-4035	平成28年9月2日 ~ 平成29年10月30日
⑩ 宮古地区道路改良工事	(株)鴻池組 東北支店	谷村、鈴長	山田宮古道路 10	0193-65-7830	平成27年10月22日 ~ 平成29年6月30日
⑪ 七田川橋外上部工事	オリエンタル白石(株)	藤田	山田宮古道路 11	0193-83-5330	平成28年8月18日 ~ 平成29年6月下旬 予定
⑫ 山田宮古地区舗装工事	常盤工業(株)	島、鈴間	山田宮古道路 12	86-2517	平成28年9月6日 ~ 平成29年11月30日
⑬ 金浜地区道路改良工事	松尾建設(株) 仙台支店	大坪	運搬終了	0193-83-5360	平成28年01月27日 ~ 平成29年3月27日

☆新工事現場紹介!新しく仲間入りします!

常盤工業(株)・世紀東急工業(株)

国道45号 山田宮古地区舗装工事 常盤工業(株)



現場代理人
島 毅

この度、国道45号 山田宮古地区舗装工事を受注した常盤工業株式会社です。工事現場は、「岩手県下閉伊郡山田町豊間根～宮古市津軽石地内」までの約5.6kmの舗装工事です。既に多くの復興事業が行なわれている中、当工事も進めさせていただくことになり、地域の皆様には大変ご負担をおかけすると思えます。これから地域の皆様に、ご理解・ご協力をいただけるように、誠心、誠意努力しますのでよろしく御願い申し上げます。工事期間中、何かありましたら遠慮なく申してください。来年度、山田宮古地区の道路が開通するように頑張っておりますので、ご支援・ご協力のほど心から御願い申し上げます。


工事進捗状況

・豊間根トンネル

現在トンネル内、コンクリート舗装を施工しています。

【機械・施工状況】

- 1日で200m施工できます。
- 1日使用するコンクリート量は、250m³(約580t)です。
- 豊間根トンネル延長709mで使用するコンクリート量は、約1800m³(約4230t)です。

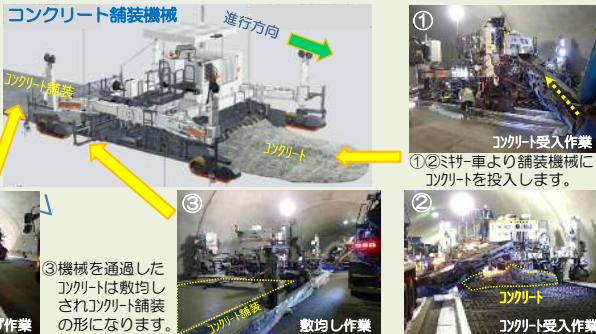

④敷均し後のコンクリート舗装面にホウキ目(細かい線)粗面仕上げをします。



③機械を通過したコンクリートは敷均しされコンクリート舗装の形になります。



②コンクリート投入作業



①②ミキサー車より舗装機械にコンクリートを投入します。

国道45号 宮古地区舗装工事 世紀東急工業(株) 東北支店



現場代理人
阪本 良輔

この度、国土交通省東北地方整備局発注による【三陸沿岸道路・山田宮古地区道路】の津軽石から金浜区間(延長L=5,360m)の舗装工事を行うことになりました。既に多くの復興事業が行われている中、当工事も進めていく上で皆様方には大変ご不便をおかけいたしますが、平成29年度の開通を目標に安全第一で工事を進めてまいりますので、何卒工事へのご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

☆国道45号荷竹地区道路改良工事が完成しました!

(施工担当: 青木あすなる建設(株)東北支店)



現場責任者
古屋 健二

宮古市津軽石荷竹地区において一昨年8月より、工事を開始し、本年2月17日をもって工事が完成いたしました。工事は宮古市と山田町をつなぐ延長680mの道路を造成しました。既に多くの復興事業が行われている中、当工事も進めさせていただくことになり、工事期間中はダンプ運搬等、地域の皆様には大変ご負担をおかけいたしました。ご要望等伺いながら工事を進めてまいりました。ご協力をいただきました地域の皆様に、心よりお礼申し上げます。工事以外では、小学校児童を対象とした登下校「見守り隊」パトロールの実施及び台風後の通学路復旧作業や安全確保活動と交流を深め、小学校及び児童から感謝状も頂きました。今後、一日も早く三陸沿岸道路が開通し、復興・発展がより進みますよう、心から願っております。ありがとうございました。



杉本さん(東京) 竹内さん(広島) 山下さん(兵庫) 長谷さん(千葉) 木村さん(埼玉) 古屋さん(東京) 白根さん(愛知)



◆児童より「感謝状」をいただきました。



◆完成切土状況



◆完成盛土状況

☆津軽石トンネルの貫通式を執り行いました!

国道45号津軽石道路工事 (施工担当: 奥村組)

2月3日(金)に、津軽石トンネル(延長491m)の「貫通式」を執り行いました。

山田宮古道路全トンネル4箇所の中で、最後の貫通となります。施工会社である奥村組主催のもと、山口副市長をはじめとする来賓、関係者約90名が出席しました。代表者による「貫通発破」後の、高柳現場代理人の音頭で万歳三唱し渡り初めを実施しました。地域を代表して大手神社の皆様に黒森神楽を演奏していただき貫通式を祝っていただきました。



◆貫通発破



◆祝辞 (山口宮古副市長)



◆挨拶 (永井三陸国道事務所長)



◆万歳三唱



◆演奏「黒森神楽」



◆樽神輿



◆鏡開き



◆貫通点通り初め

☆各道路の一斉清掃・除雪作業を実施しました!

(山田宮古道路安全連絡協議会)

山田宮古道路の工事施工者で構成する「山田宮古道路安全連絡協議会」による一斉清掃を平成29年2月4日(土)・7日(火)に実施、除雪作業は、平成29年2月10日(金)に実施しました。

【清掃状況】



◆国道45号 山田町大沢地区

【除雪作業状況】



◆通学路(豊間根中学校) 山田町豊間根地区



◆保育園駐車場 山田町豊間根地区

現在、工事が全面展開しています。皆様にはご不便をお掛けいたしますが、平成29年度の開通を目標に進めてまいります。工事へのご理解とご協力を何卒お願いいたします。



お気付きの点がございましたら
ご意見・ご感想をお寄せください。

現場見学会の申し込みも待ってるよ!

☆チラシのバックナンバーをご希望の方は、下記の電話番号にご連絡ください。

国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 建設監督官 木村・三上
〒027-0029 宮古市藤の川4番1号 TEL0193-71-1745
ホームページ <http://www.thr.mlit.go.jp/sanriku/index.html>



発行: 山田宮古道路安全連絡協議会
三陸沿岸道路事業促進チーム (PPP山田宮古)
編集・監修: 三陸国道事務所 建設監督官
