


登米志津川道路[登米東和IC～志津川IC](No.490～No.680)工事進捗状況

H24年9月末時点

- [凡例]
- 橋梁・公道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠
 - 完成・一部完成




国道45号 登米志津川道路上部工工事
受注者：川田工業（株）
工期：H24. 3. 22～H25. 3. 22

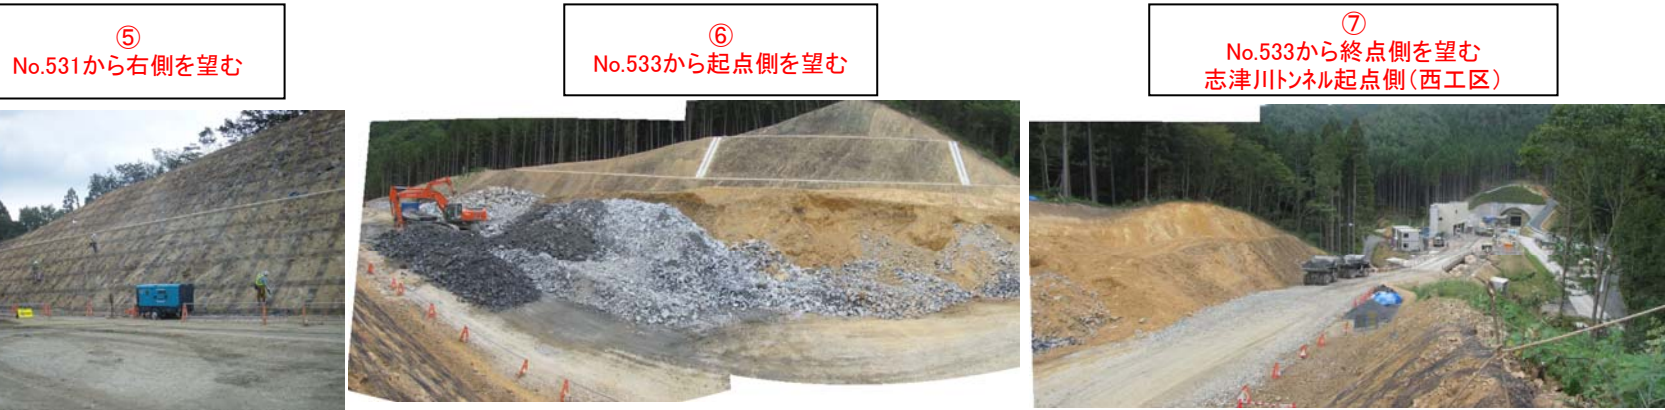

- ①福平橋
- ②大岩久保沢橋
- ③寺沢川橋

岩沢地区道路改良工事
受注者：若生工業（株）
工期：H24. 3. 8～H24. 11. 16

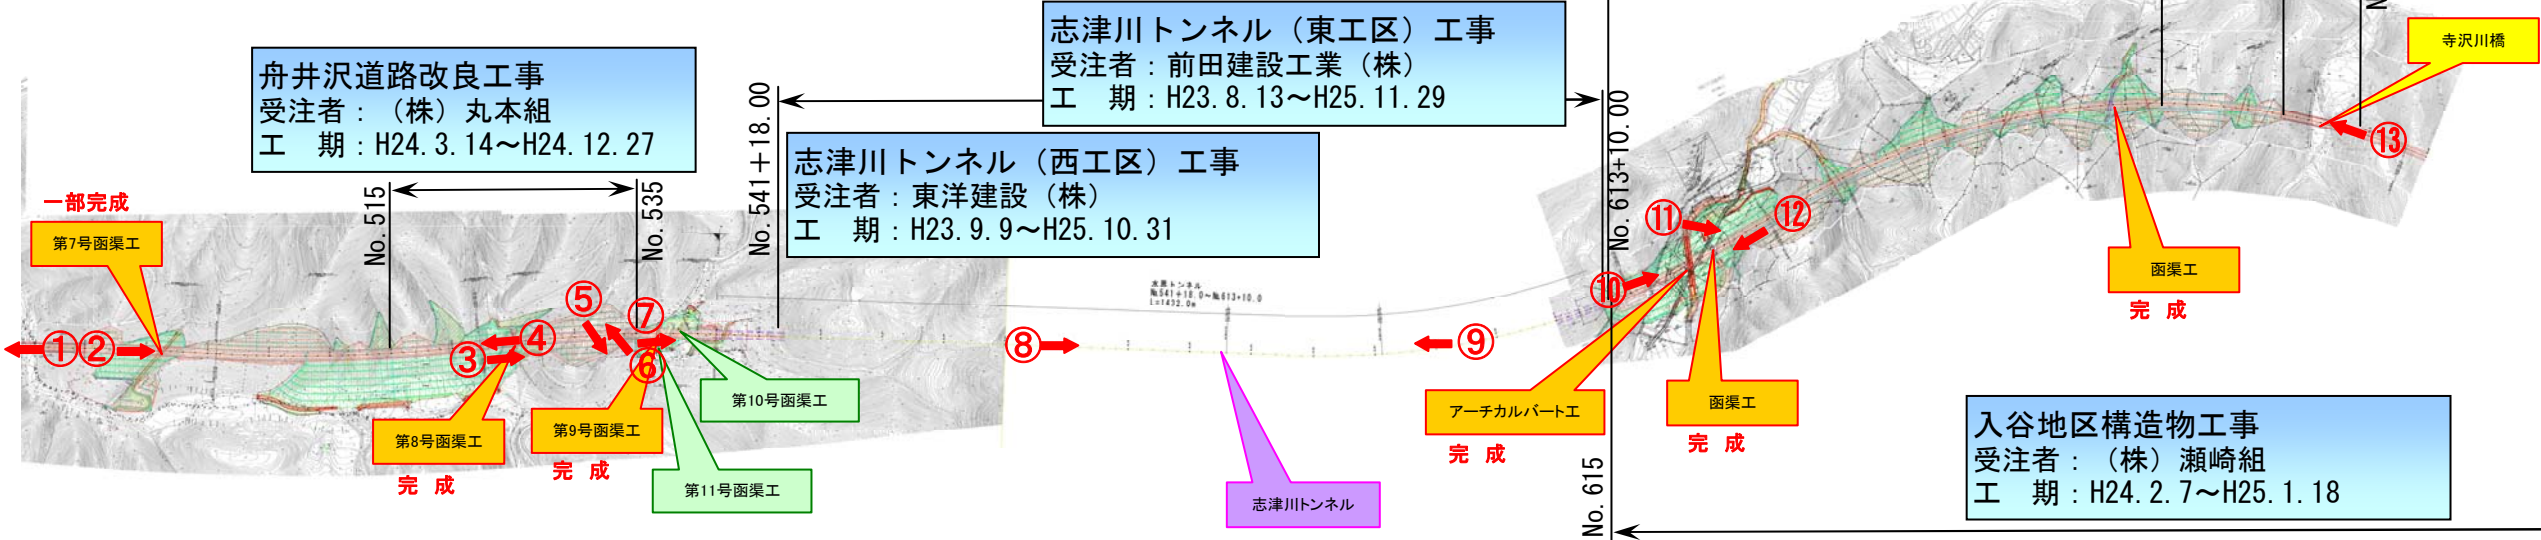

舟井沢道路改良工事
受注者：(株)丸本組
工期：H24. 3. 14～H24. 12. 27

志津川トンネル(東工区)工事
受注者：前田建設工業(株)
工期：H23. 8. 13～H25. 11. 29

志津川トンネル(西工区)工事
受注者：東洋建設(株)
工期：H23. 9. 9～H25. 10. 31

入谷地区構造物工事
受注者：(株)瀬崎組
工期：H24. 2. 7～H25. 1. 18

