

矢本石巻道路[石巻女川IC～河北IC](No.1085(No.5)～No.200)工事進捗状況

< 石巻女川IC～桃生豊里ICの延長12.1kmの4車線化 >

H28年12月上旬時点

《工事の種類》

- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
- 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
- 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
- トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事
- 舗装** 舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事
例：〇〇舗装工事

〔凡例〕

- 橋梁・こ道橋 (計画)
- トンネル (計画)
- 道路函渠 (計画)
- 水路函渠 (計画)
- 完成・一部完成




小船越地区舗装工事
受注者：大成ロテック(株)
工期：H28.10.1～H29.3.17

曾波神地区舗装工事
受注者：鹿島道路(株)
工期：H28.6.28～H29.3.10

河北IC改良工事
受注者：(株)植木組
工期：H28.2.27～H29.1.31

鹿又南地区舗装工事
受注者：鹿島道路(株)
工期：H28.6.28～H29.3.10

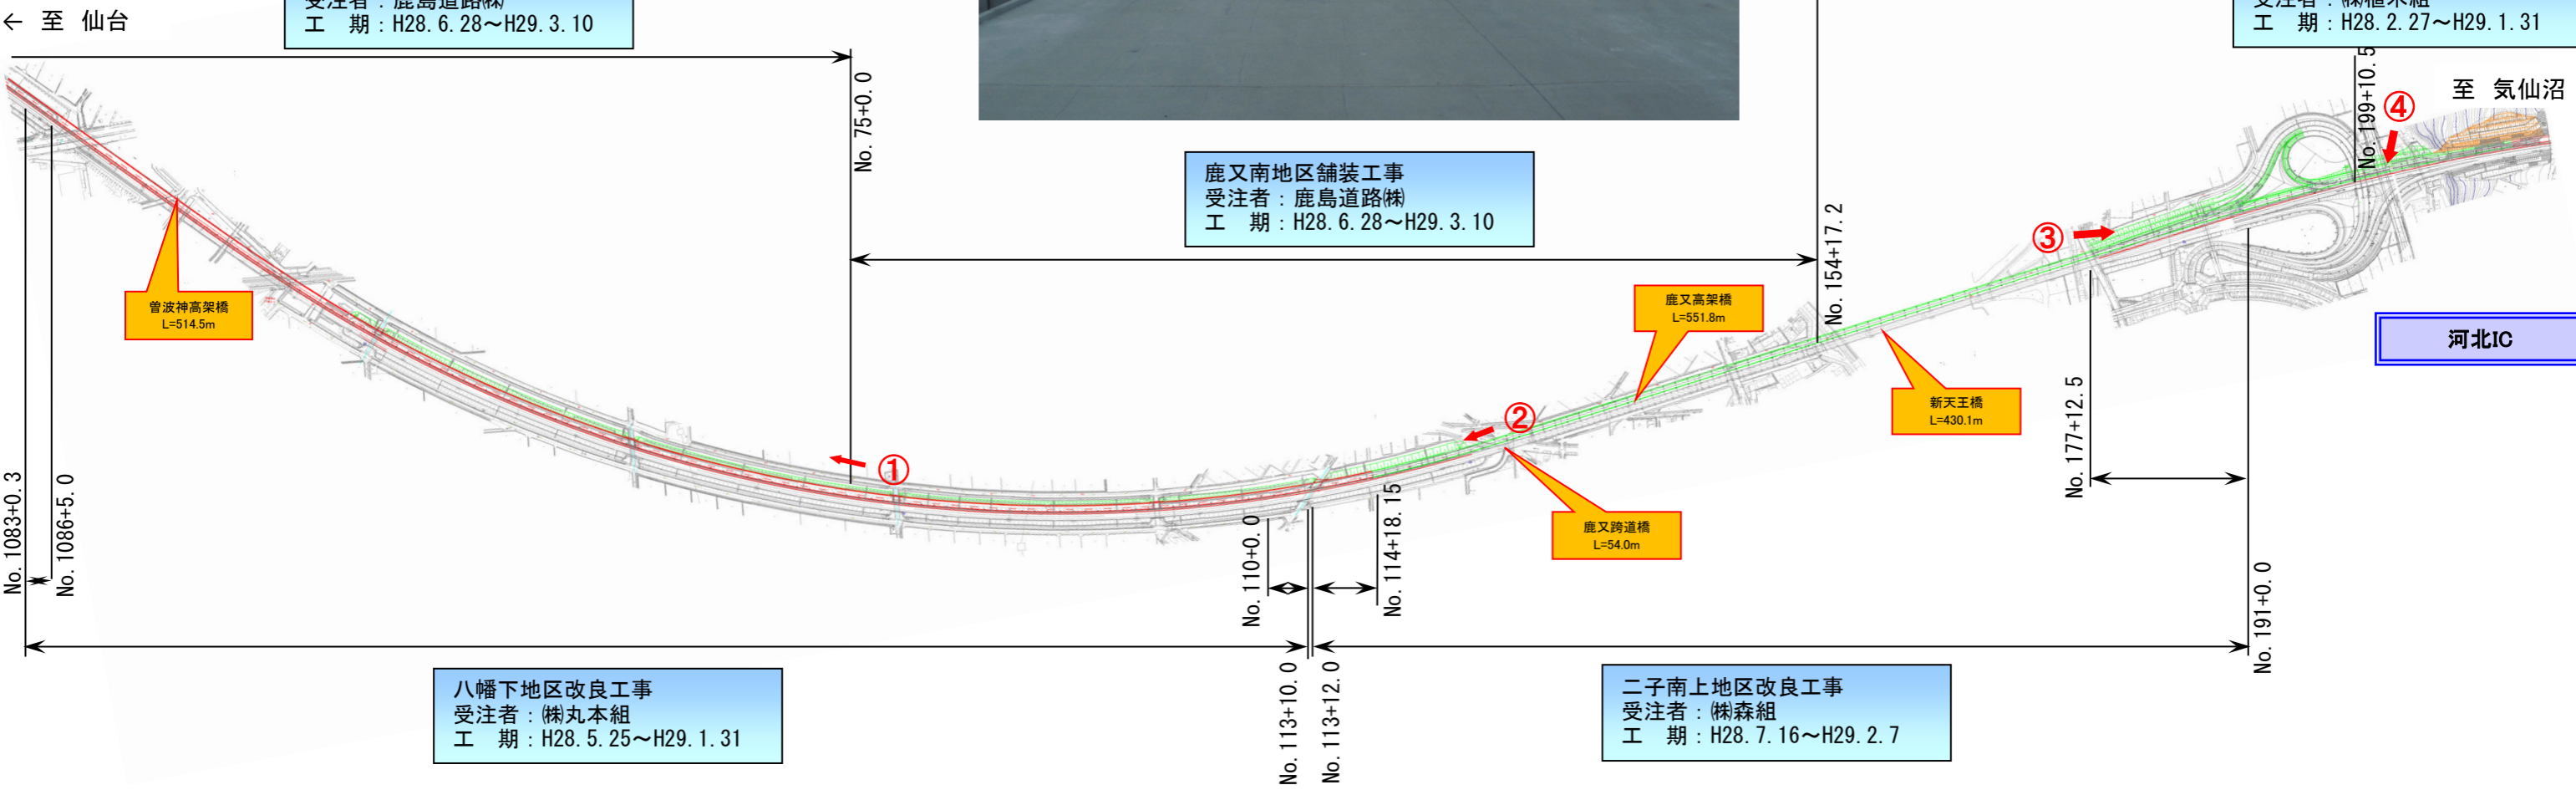

八幡下地区改良工事
受注者：(株)丸本組
工期：H28.5.25～H29.1.31

二子南上地区改良工事
受注者：(株)森組
工期：H28.7.16～H29.2.7

