

国道45号 復旧・復興事業 **がんばろう!東北**  
伊里前・港地区 工事状況のお知らせ vol.5


令和2年4月1日現在

発行：  伊里前・港地区安全連絡協議会  
東北地方整備局 仙台河川国道事務所


いっばんこくどう みなみさんりくちょううたつちく  
**一般国道45号 南三陸町歌津地区**  
**令和2年4月8日(水)に交通切替えします！**

南三陸町歌津地区の一般国道45号は、東日本大震災の津波で歌津大橋の一部が流出するなどの被害を受け、これまで「伊里前復興まちづくり事業」や「二級河川伊里前川災害復旧事業」等と調整を図りながら、新橋の整備や嵩上げなどの工事を進めてきました。

このたび、道路整備が進み、**令和2年4月8日(水)午後9時頃**に新しい道路に交通を切り替えます。今回の開通区間は、本吉郡南三陸町歌津字町向～同町字伊里前 地内の約1.0kmとなっております。なお、交通切替え後も工事が続きますので、当該区間周辺の通行の際には引き続き現場の案内標識の誘導に従って交通事故防止、安全運転へのご理解とご協力をお願いします。

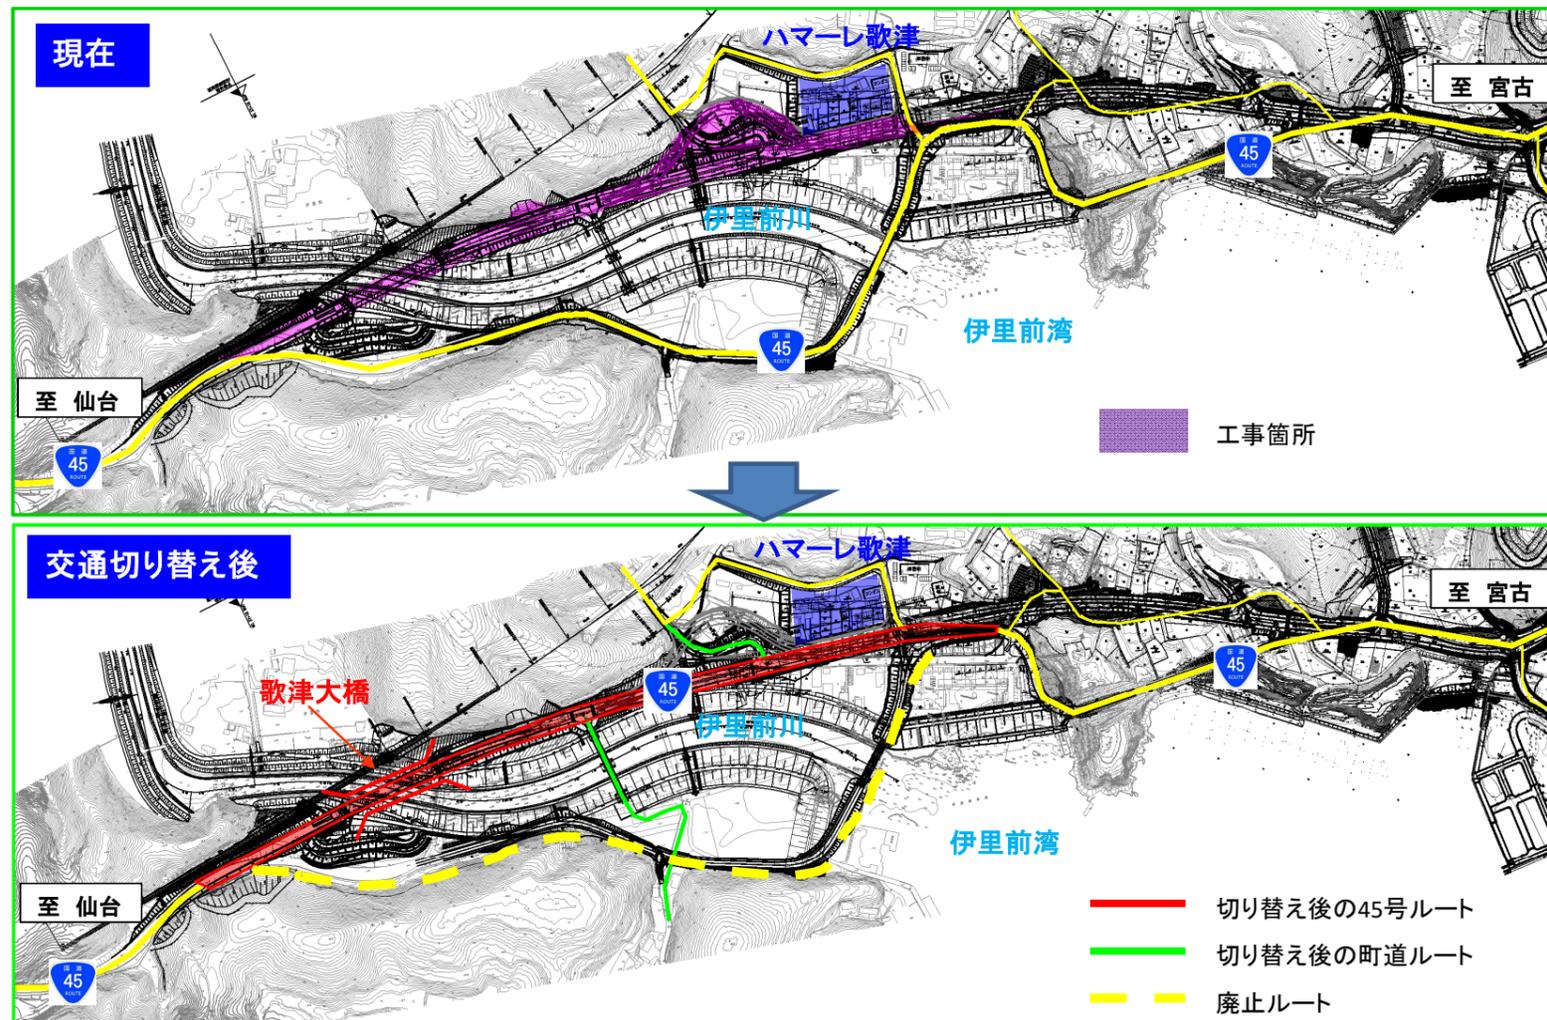

# 工事に伴う通行止めのお知らせ

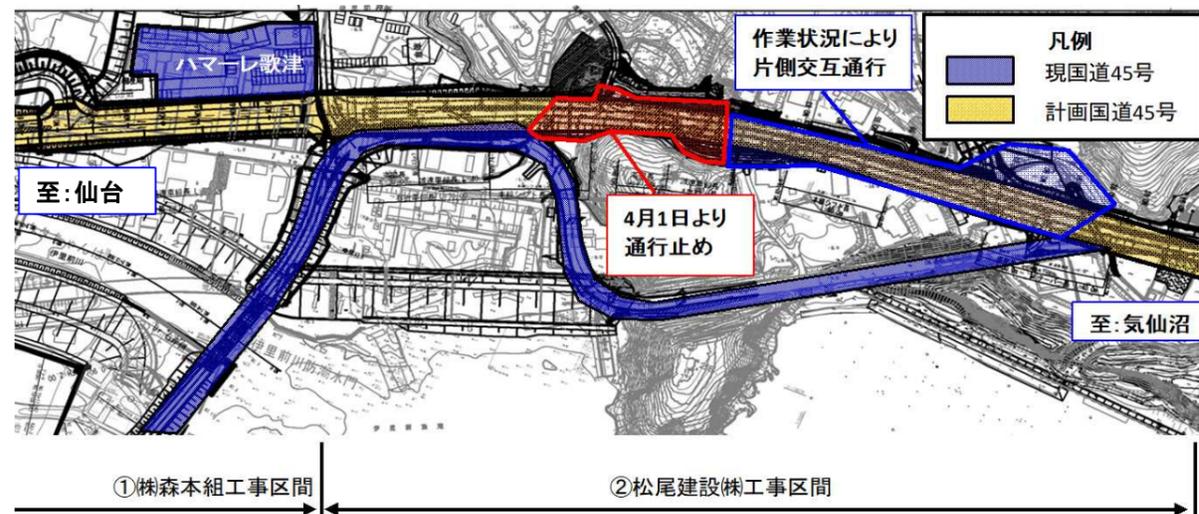

国道45号工事に伴い令和2年4月1日より、旧国道45号と町道港橋線の一部が通行止めとなります。(上記図面参照)  
 近隣の皆様にはご不便おかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 松尾建設(株)

伊里前・現在の状況 3月24日撮影



## 令和元年度 歌津伊里前地区 工事一覧表

No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL
①	歌津地区道路改良舗装工事	R1.6.26~R2.3.25	株森本組	0226-48-5593
②	管の浜道路改良舗装工事	R1.10.18~R2.3.27	株松尾建設	0226-36-2058



# ～ 港地区工事状況のお知らせ～

## ① 港地区護岸工工事 施工状況




堤防の主となる盛土材料を、ブルドーザで30cm毎層状に敷均し・転圧を行っています。(A1橋台川表部)




盛土を締め付けた後、斜面となる部分をバックホウのロングアームを使用し整形を行っています。



斜面を覆う為のコンクリートブロック(2t/個)を、設置しています。(山側・仙台側)

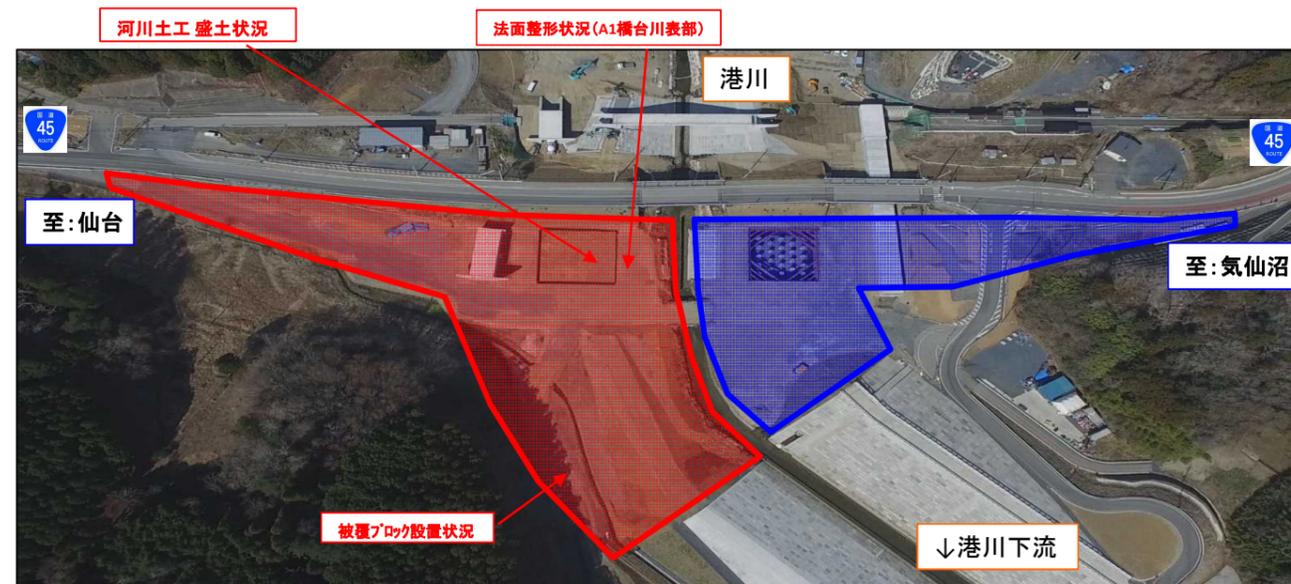

## ② 南三陸地区護岸工工事 施工状況

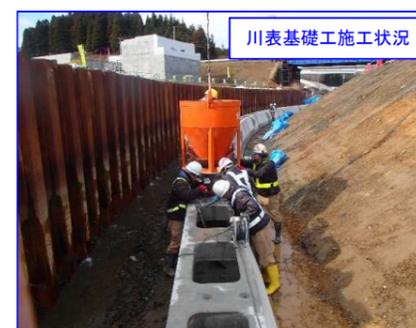

護岸の基礎となる基礎ブロックの施工が完了しました。(川表側)



堤防法面の下部へコンクリートブロックの設置を行いました。(川表側)



橋台(国道45号線)の背面に補強土壁工の施工を進めています。

## 令和元年度 歌津港地区 工事一覧表

No.	工事名	工期	受注者	現場事務所TEL
①	歌津港地区護岸工工事	R元.7.2~R2.5.7	熱海建設(株)	0226-25-8015
②	南三陸地区護岸工工事	R元.10.2~R2.5.15	株佐藤工務店	0226-29-6368

