

供養佛地区緊急工事の進捗情報

【平成25年11月22日～12月26日】

No5

[作成・連絡先] 国土交通省湯沢河川国道事務所 秋田駒ヶ岳山系砂防出張所
Tel: 0187-46-2681

10月1日より国による緊急工事に着手しました。

12月26日までの工事状況は以下のとおりです。

なお、12月30日より冬期一時工事休止いたします。（次回のお知らせは、工事再開予定3月中旬の予定）

■進捗状況および今後の予定

平成25年10月1日から12月26日までの工事状況

工事用道路の造成		完了
倒木および土砂処理		完了
落石対策（雪崩防止兼用）		仮設土のう、設置完了（延長約50m、2段積、135袋） 落石防護柵、設置完了（延長約40m、高さ約3m）
砂防本体工事 12月30日より 一時工事休止	掘削工事	10月25日より掘削を開始し、11月27日に完了
	地盤改良工事	11月23日より着手し、12月7日に完了
	コンクリート打設	12月3日より着手し、年内は12月26日まで打設（堰堤底部で、約2mの打設完了） 工事再開は、年明け3月中旬を予定しています


■工事状況



コンクリート養生状況（12月20日撮影）



工事着手前（9月27日撮影）

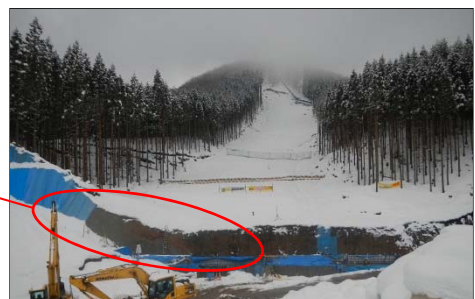

12月25日現在の状況
