

矢本石巻道路[河北IC～桃生豊里IC](No.200～No.400)工事進捗状況

< 石巻女川IC～桃生豊里ICの延長12.1kmの4車線化 >

H28年8月上旬時点



① No.215付近から終点側を望む



舗装 ② No.316から起点側を望む

- 《工事の種類》
- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
 - 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
 - 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
 - トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事
 - 舗装** 舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事
例：〇〇舗装工事


- [凡例]
- 橋梁・公道橋 (計画)
 - トンネル (計画)
 - 道路函渠 (計画)
 - 水路函渠 (計画)
 - 完成・一部完成

河北IC

崎山地区舗装工事
受注者：鹿島道路株
工期：H28. 6. 28～H29. 3. 17

太田南地区舗装工事
受注者：世紀東急工業株
工期：H28. 6. 29～H29. 3. 17

飯野太田改良工事
受注者：日本国土開発株
工期：H28. 4. 26～H28. 12. 15

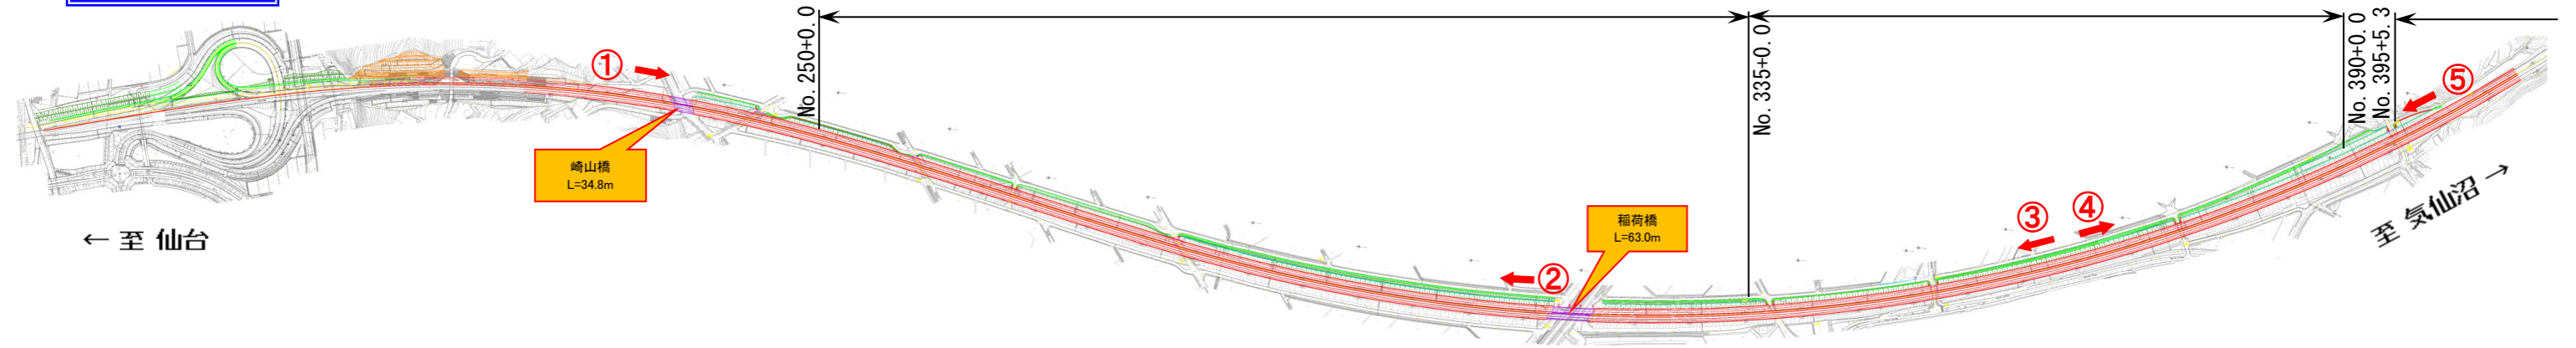

③ No.351から起点側を望む



④ No.351から終点側を望む



⑤ No.400付近から起点側を望む
