


工事進捗状況

閘上水下流工区では、新しい堤防の下を地盤改良工事を行っています。

- ・川裏側の護岸の矢板基礎の打込完了しました。
- ・地盤改良（パワーブレンダー工法）を実施しました。
- ・護岸基礎を設置していきます。

断面図

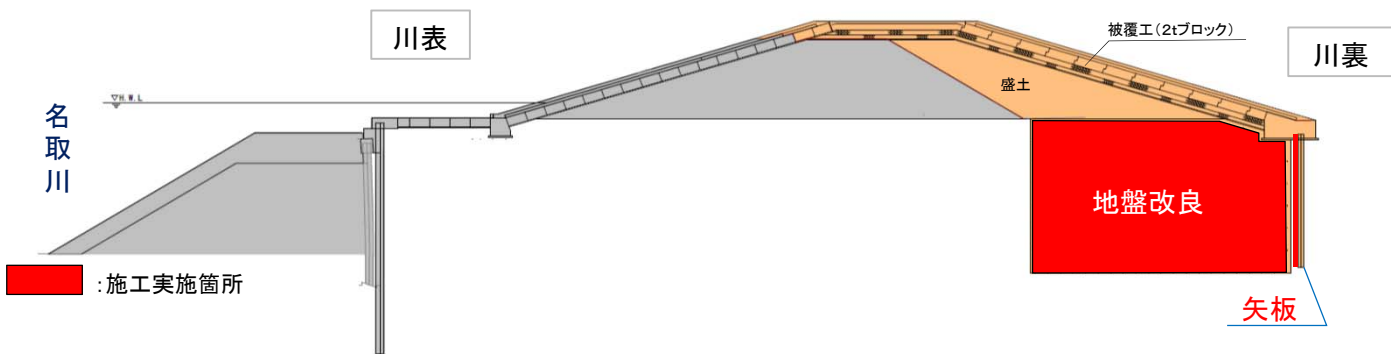

状況写真

UAV写真 (H28.1.9状況)



地盤改良工 (パワーブレンダー工法)



矢板基礎工 (リーダーレス打込)

