




重点「道の駅」
道の駅 米沢 の整備状況

米沢市 産業部 商工課 道の駅開設準備室

工事の進捗状況

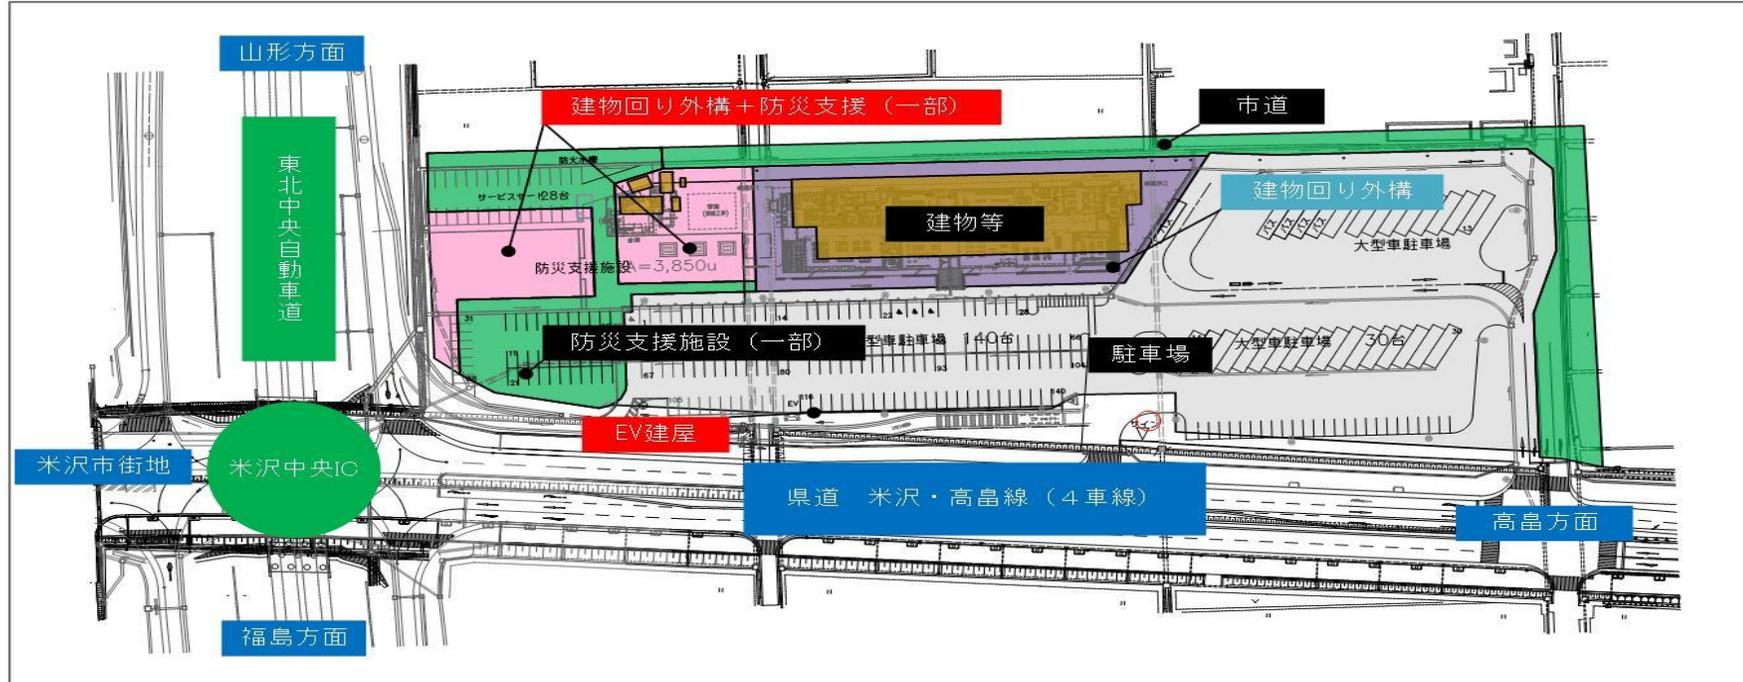

建物工事

【建物本体・倉庫・喫煙所・バルクタンク】

工期 平成29年3月24日～平成30年3月16日
受注者
建築工事 相田・米木建設JV
機械設備 情野冷熱機工㈱
電気設備 ㈱スズデン米沢支店
工事監理 ㈱鈴木建築設計事務所

【進捗状況】

建築 90.42%(12月末現在)
機械 83.86%(12月末現在)
電気 76.89%(12月末現在)

【急速充電器設置工事】

工期 平成29年9月4日～平成29年11月30日
受注者 ㈱スズデン米沢支店
工事概要 建屋工事、受電設備設置工事

【進捗状況】

100%(11月末完了)

外構工事

【道元立西谷地線外 道路改良舗装工事】

工期 平成29年4月25日～平成30年3月27日
受注者 置賜建設㈱
工事概要
舗装工 アスファルト舗装 A=4,178㎡
排水工 側溝工 L=402m、集水樹工 N=7基
安全施設工 照明灯 N=3基

【進捗状況】

96.2%(12月末現在)

【駐車場舗装工事】

工期 平成29年7月6日～平成30年3月31日
受注者 ㈱後藤組
工事概要
舗装工 アスファルト舗装 A=10,710㎡
排水工 側溝工 L=458m、集水樹工 N=3基
安全施設工 照明灯 N=9基

【進捗状況】

91.5%(12月末現在)

【外構その他工事①】

工期 平成29年9月12日～平成30年3月27日
受注者 相田建設㈱
工事概要
舗装工 アスファルト A=540㎡
インターロッキング舗装 A=810㎡
安全施設工 照明灯 N=5基
付属施設工 車止め N=63基

【進捗状況】

24.5%(12月末現在)

【外構その他工事②】

工期 平成30年1月13日～3月30日
受注者 米木建設㈱
工事概要
舗装工 アスファルト舗装
安全施設工 照明灯、車止め
芝生工 * 平成30年度に繰越
防災シェルター(四阿)

【進捗状況】

0%

現場写真 (H30.1.16現在)

建物本体 (西側から)



建物本体 (正面)



建物本体 (東側から)



建物本体 (正面)



無料休憩所・ファストフード



フードコート



米沢牛レストラン牛毘亭



特産品・農産物直売所



コンビニ



鳥瞰イメージ

敷地面積 21,677㎡
東西約250m
南北(最大)約90m
建物本体延床面積 1,836㎡
東西82m・南北23m
駐車場
大型車用 30台
普通車 130台
パーク&ライド用 25台
臨時用(防災支援) 38台
* 普通車最大198台

米沢中央IC

福島・東京方面 ← 東北中央自動車道 → 山形・秋田方面

倉庫

建物本体

防災支援施設

EV充電スタンド

万世大路の碑

バス停留所

米沢市街地 ← 県道米沢高畠線 → 高畠方面

パーク&ライド用駐車場

館内施設

牛毘亭

米沢ブランドの代表格である米沢牛をゆっくり味わえるレストラン。米沢・山形の「食」の豊かさを全国にPRします。

道路情報 コーナー


高速道路などの利用者が安心して通行できるよう、道路雪情報などをモニターで表示し、24時間情報発信します。

トイレ

女性用トイレには有機ELの照明を使用したパウダールームを設置し、美しく快適な旅行をサポートします。

総合観光 案内所

市内・県内の情報発信基地として、観光コンシェルジュを配置し、道の駅にお越しのお客様に豊かな旅をご案内します。

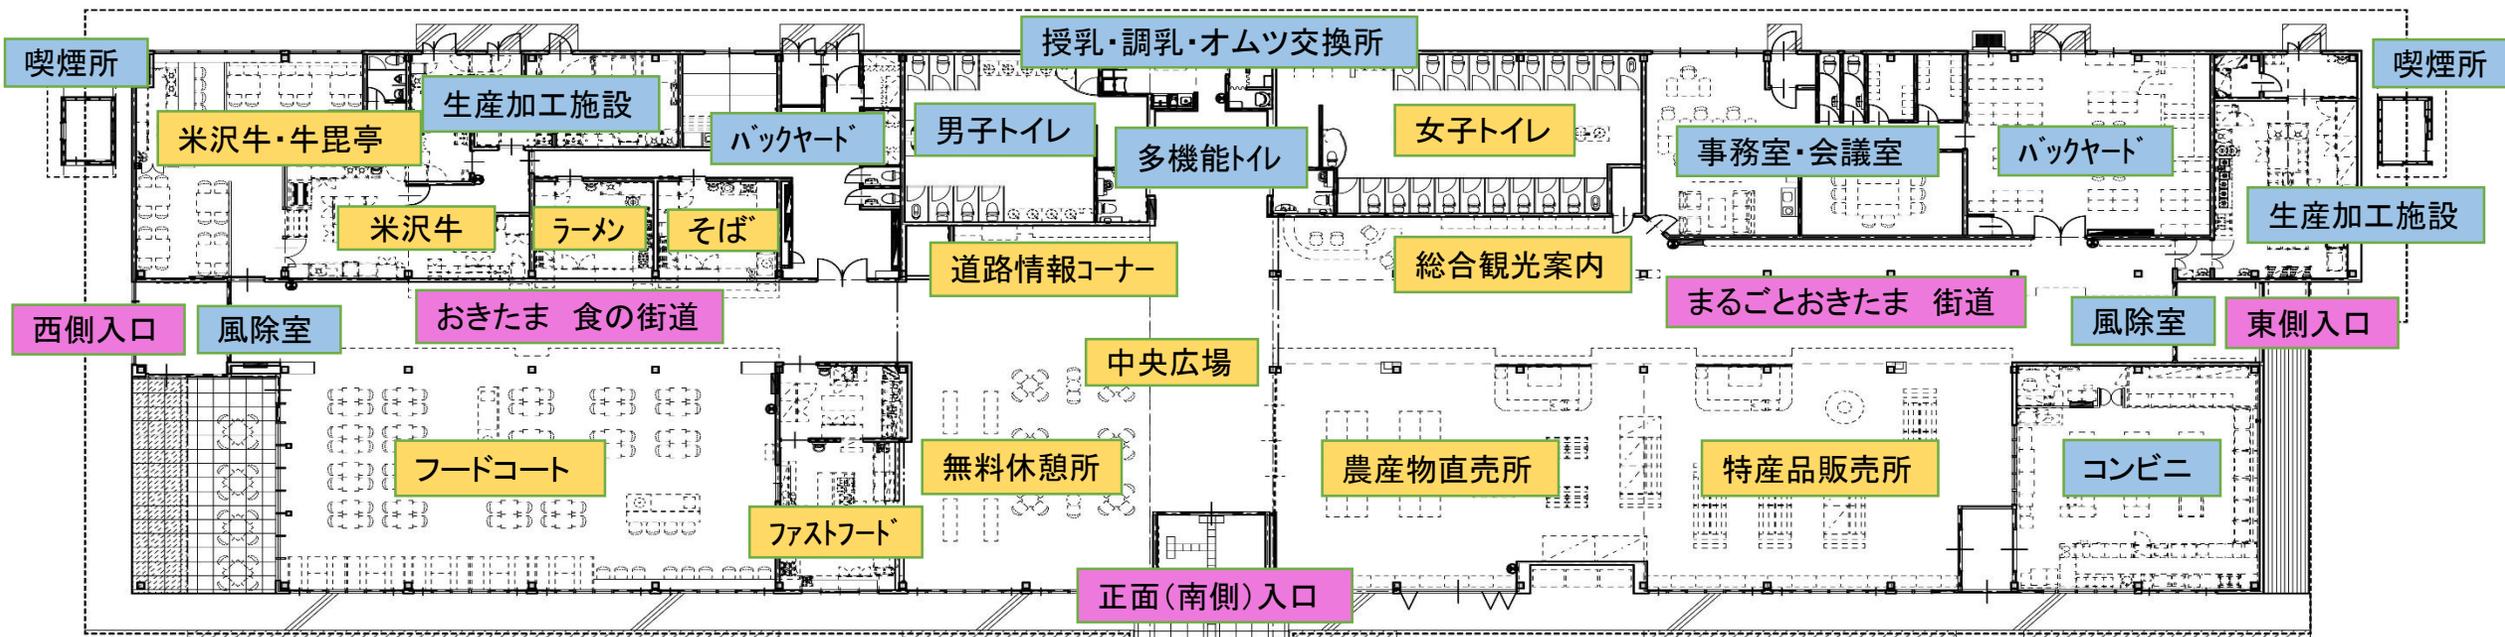

フード コート

山並みや田園風景を眺めながら、米沢を代表するラーメン、そば、牛丼などの専門店の味を召し上がれ♪

ファスト フード

地元の素材にこだわった手軽に楽しめる軽食やスイーツをお手頃価格で提供します。

農産物 直売所

米沢をはじめ置賜一円から、新鮮で取れたての安全・おいしい農畜産物や総菜などを販売します。

特産品 販売所

置賜3市5町や姉妹都市などのこだわりの物産品・特産品を豊富に取り揃えます。

館内施設イメージ




酒展示・販売コーナー



県内全53蔵の日本酒と全14蔵のワインを取り揃える

無料休憩所内子ども用休憩所

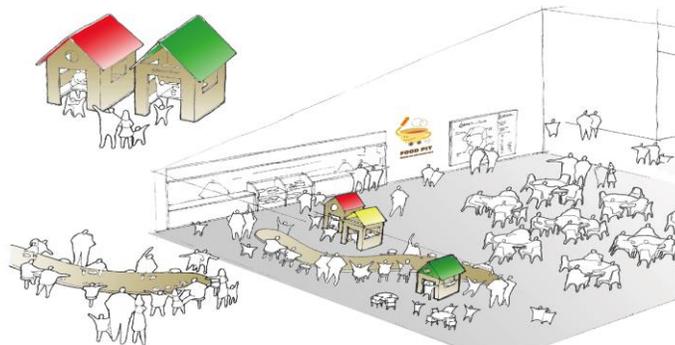

工事以外の進捗状況

総合観光案内所

- 運営主体：（一社）米沢観光コンベンション協会
（所長1名・観光コンシェルジュ4名採用）
- 旅行業第2種登録
- 外国人観光案内所付ゴリ-IIを取得予定
- 県・置賜管内の市町と連携して周遊観光商品等を開発中

農産物直売所、加工所、特産品販売所

- 農産物直売所
置賜管内の市町から130名の農家が出荷登録
- 農産加工所（かあちゃんの台所）
登録農家を中心に運営、加工商品開発中
- 特産品販売所（米沢53社、置賜9社、県内3社）
65社の取引先が商談で決定、棚割等準備中

開業日・開業記念事業

- 開業日 平成30年4月20日（金）
10:00～記念式典 12:00～一般開放
- 4月19日（木）報道関係者等を招き内覧会開催
- 開業記念事業
平成30年4月20日～5月6日
土日祝日を中心にイベントを展開

運営管理・その他

- 運営主体：（株）アクセスよねざわ
（約50名雇用）
- 平成29年11月17日 道の駅登録
- 住民公募債を3月に発行予定（総額2億円）
- 高速バス米沢・仙台便の停留所を設置予定

事業費・活用する補助事業等

● 全体事業費

単位：千円

年度	全体	山形県	米沢市				交付税措置
				補助金等	地方債	一般財源	
H26年度	2,843		2,843			2,843	
H27年度	138,241	82,340	55,901		17,700	38,201	
H28年度	1,788,208	409,860	1,378,348	301,000	916,900	160,448	104,950
H29年度	406,438	54,347	352,091	92,406	53,800	205,885	4,553
合計	2,335,730	546,547	1,789,183	393,406	988,400	407,377	109,503

合計額 502,909 ←

* 平成26・27年度は実績額、平成28年は見込額、平成29年度は予算額

● 活用する補助事業等

単位：千円

所管	事業名称	助成率	申請(予定)額
国土交通省	社会資本整備総合交付金	55/100	143,796
農林水産省	中山間地域所得向上支援対策事業交付金	1/2	180,000
経済産業省	次世代自動車充電インフラ整備促進事業費補助金	定額等	7,000
環境省	再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業補助金	2/3	24,600
山形県	山形県元気な6次産業化応援プロジェクト事業補助金	1/3	23,000
山形県	やまがた道の駅緊急整備支援事業費補助金	1/2	5,000
観光庁	東北観光復興対策交付金	8/10	10,010
合計			393,406
