

国道349号 山側への別ルート(別線整備) 工事進捗状況

令和5年8月末時点

① 道路改良工事施工中




② 上部工工事施工中



③ 道路改良工事施工中




④ 道路改良工事施工中

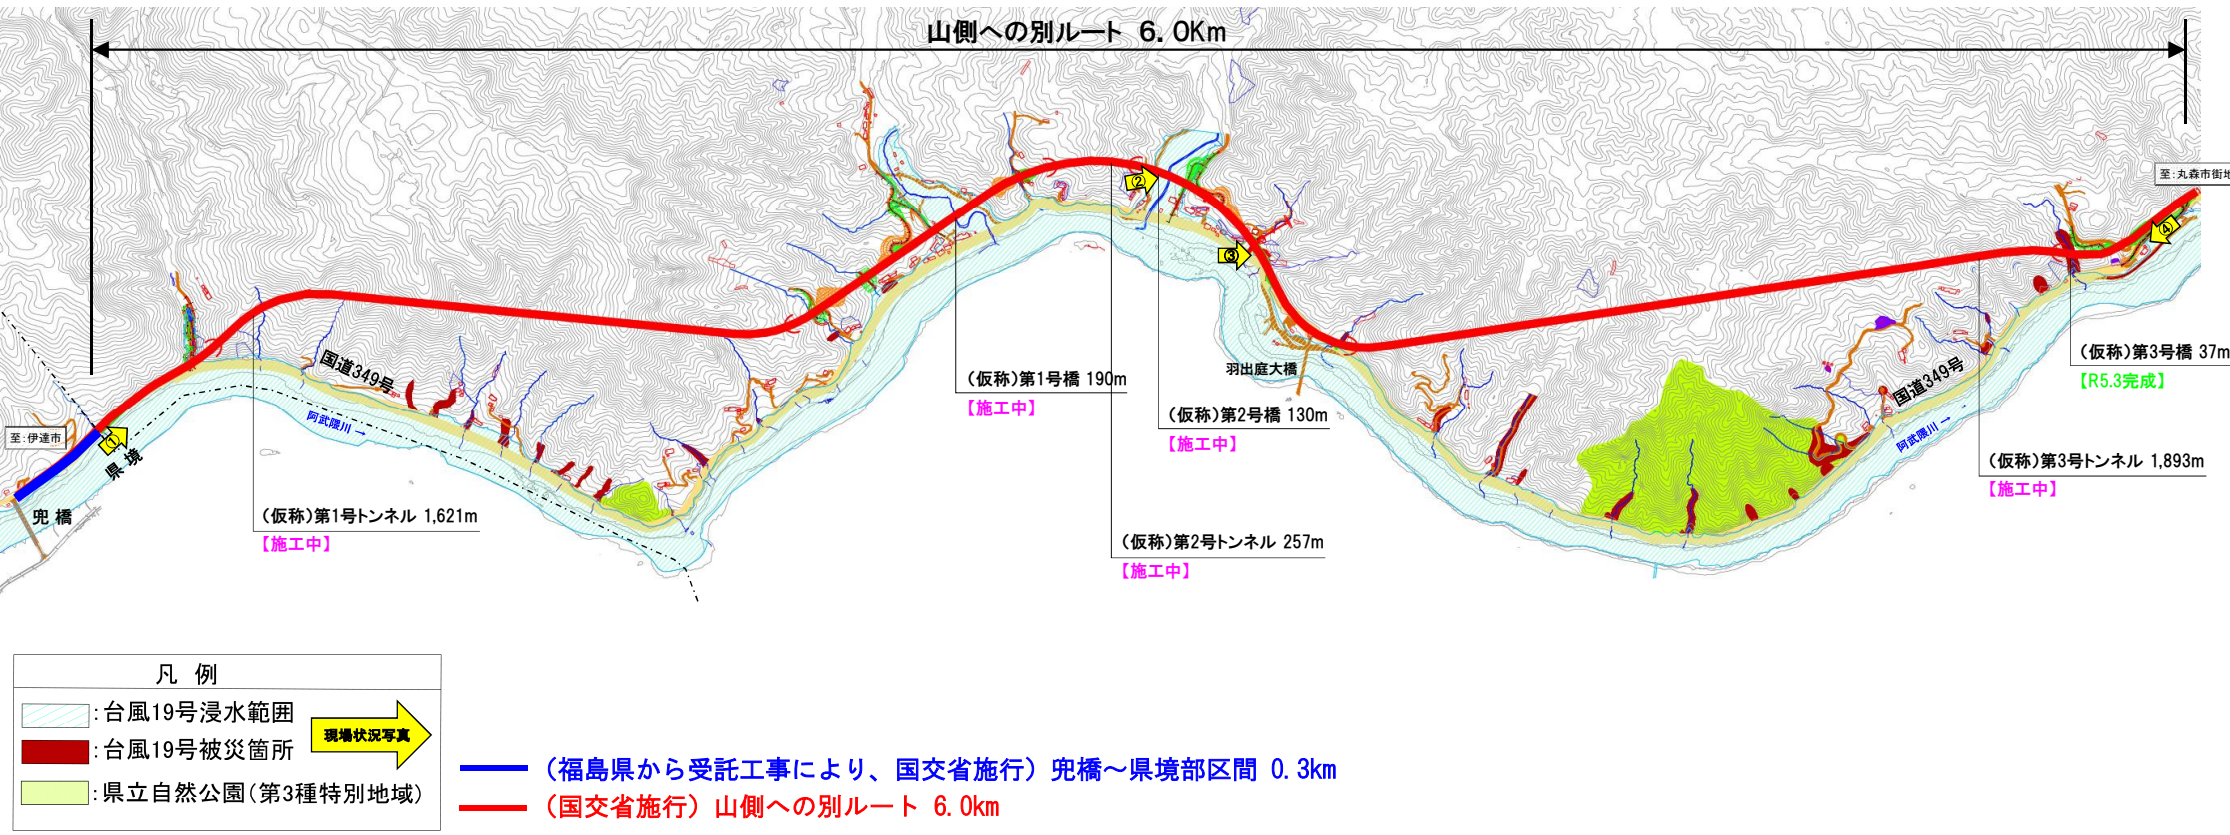

(仮称)第1号トンネル 進捗状況

令和5年8月末時点

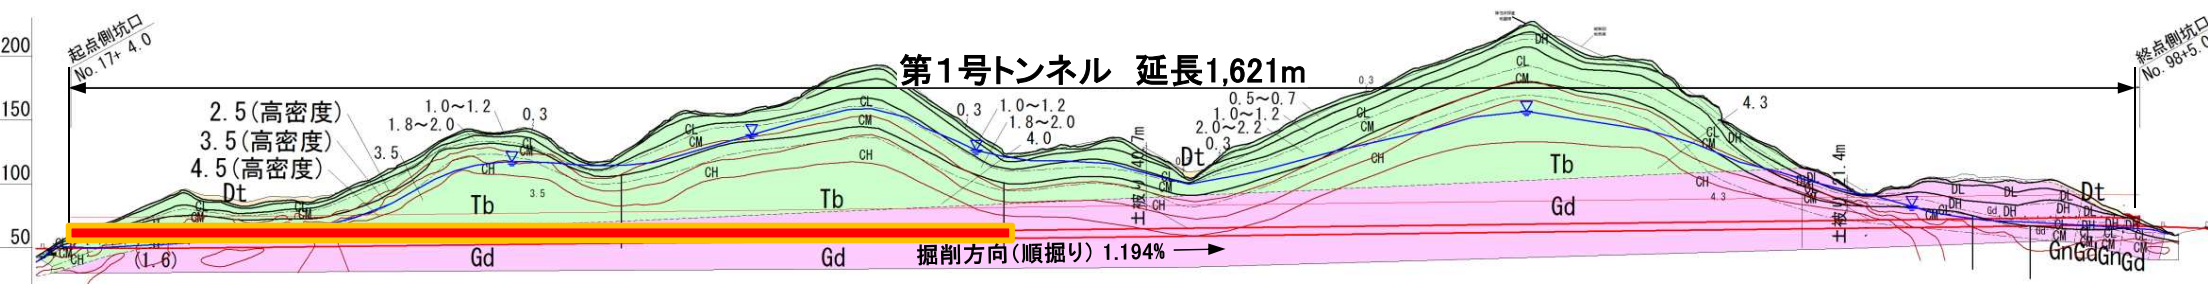

	進捗状況		進捗率
トンネル掘削	745m	／ 1,621m	46%
覆エコンクリート	148m	／ 1,621m	9%

層序表					
地質時代	地層名				土性・岩相
	既存資料	丸森町地質図	本調査区分	記号	
第四紀 完新世	現河床堆積物	第四系	現河床堆積物	Rd	礫・砂・粘土
	崖錐堆積物		崖錐堆積物	Dt	礫混じり土砂
	—		沖積層	A	礫(Ag)・砂(As)・粘土(Ac)
第三紀 中新世	雲山層	雲山層	凝灰角礫岩	Tb	凝灰角礫岩 安山岩溶岩(An)
	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	Gd	花崗閃緑岩 片麻岩(Gn) 閃緑岩(Di)




▲ 起点側(伊達市側)坑口全景



▲ トンネル坑内状況

(仮称)第2号トンネル 進捗状況

令和5年8月末時点

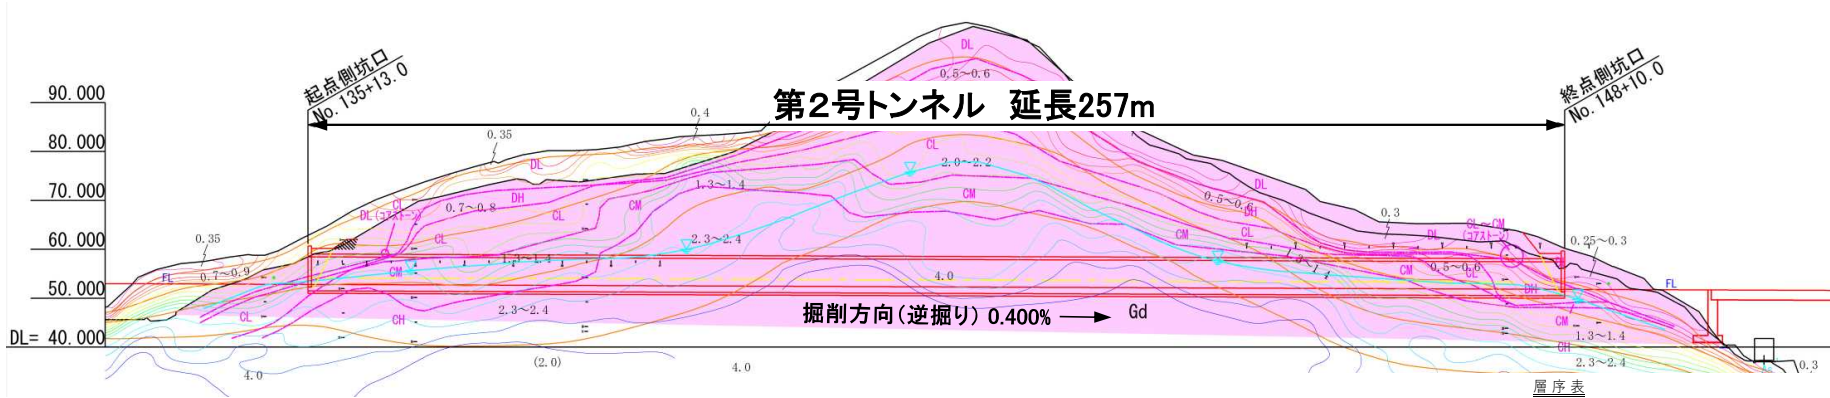

	進捗状況		進捗率
トンネル掘削	0m	257m	0%
覆エコンクリート	0m	257m	0%

地質時代	地層名			土性・岩相
	既存資料	丸森町地質図	本調査区分	
第四紀 完新世	現河床堆積物	第四系	現河床堆積物	Rd 礫・砂・粘土
	崖錐堆積物		崖錐堆積物	Dt 礫混じり土砂
	—		沖積層	A 礫(Ag)・砂(As)・粘土(Ac)
第三紀 中新世	霊山層	霊山層	凝灰角礫岩	Tb 凝灰角礫岩
			安山岩溶岩	An 安山岩溶岩
中生代 白亜紀	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	Gd 花崗閃緑岩
			片麻岩	Gn 片麻岩
			閃緑岩	Di 閃緑岩




▲ 起点側(伊達市側)坑口全景



▲ 終点側(丸森町側)坑口全景

(仮称)第3号トンネル 進捗状況

令和5年8月末時点

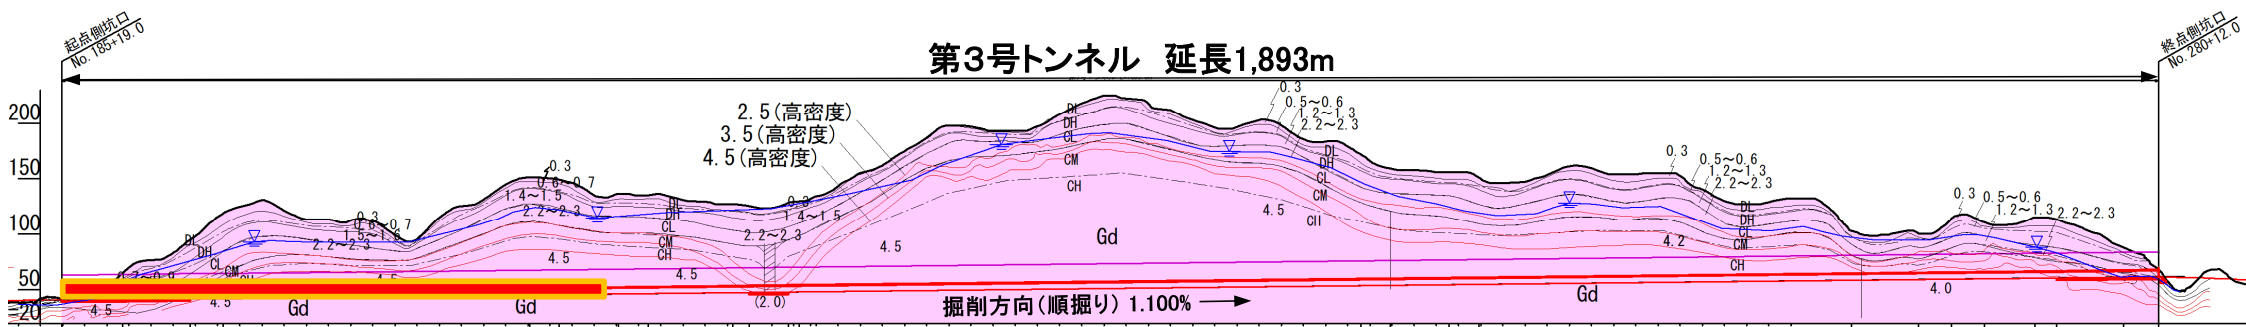

	進捗状況		進捗率
トンネル掘削	472m	／ 1,893m	25%
覆エコンクリート	13m	／ 1,893m	1%

地質時代	地層名				土性・岩相
	既存資料	丸森町地質図	本調査区分	記号	
第四紀 完新世	現河床堆積物	第四系	現河床堆積物	Rd	礫・砂・粘土
	崖錐堆積物		崖錐堆積物	Dt	礫混じり土砂
第三紀 中新世	—		沖積層	A	礫(Ag)・砂(As)・粘土(Ac)
	—		凝灰角礫岩	Tb	凝灰角礫岩
中生代 白堊紀	雲山層	雲山層	安山岩溶岩	An	安山岩溶岩
	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	Gd	花崗閃緑岩
中生代 白堊紀	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	片麻岩	Gn	片麻岩
	花崗閃緑岩	花崗閃緑岩	閃緑岩	Di	閃緑岩



▲ 起点側(伊達市側)坑口全景



▲ トンネル坑内状況
