

プレキャスト函体の設置が完了しました！


2014.1.10



【工事概要】


- 工事箇所 : つがる市柏下古川 地内 (岩木川左岸 28.4K 付近)
- 工 期 : 平成25年9月7日 ~ 平成26年1月31日 (予定)
- 施工業者 : ㈱脇川建設工業所
- 工事内容 : 堤内地の雨水等を岩木川へ流すための堤防を横断する排水施設や、岩木川が増水した際に堤内地へ水が逆流しないようにするためのゲートやそのゲート进行操作する装置などの施設を造ります。

○計画図

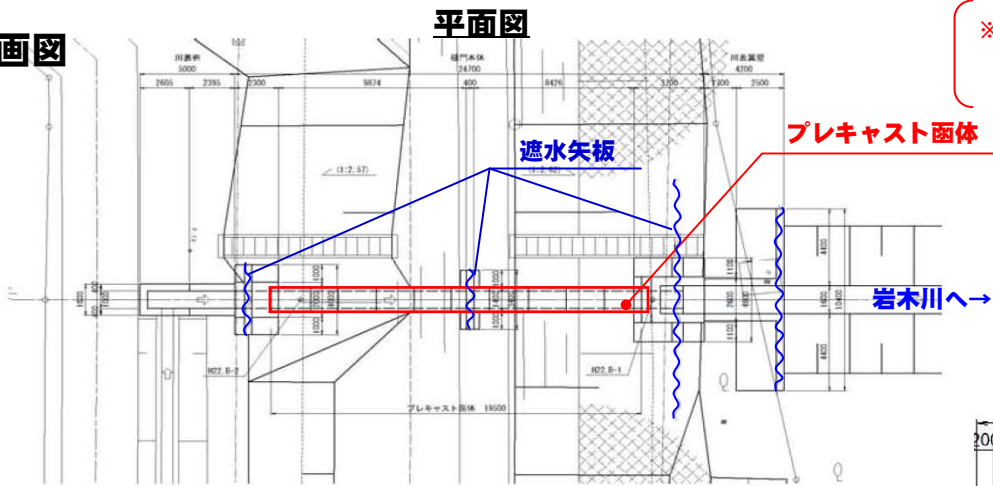


※ プレキャスト函体は、工場で作ったコンクリートの構造物です。

断面図

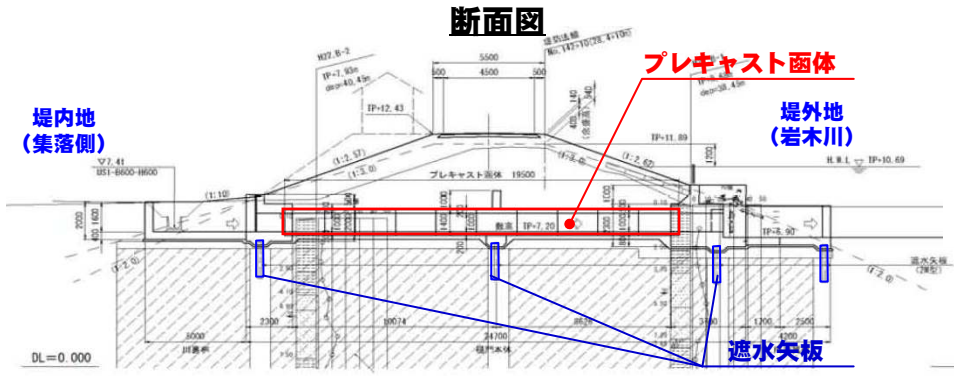


樋管断面図

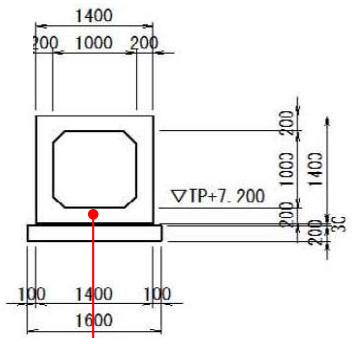

プレキャスト函体

## 《進捗情報 H26. 1. 9 現在》

### 【主な作業工程】



堤防掘削後、樋管を設置するために必要な堤防から下の掘削



樋管の下から浸水を防ぐため、遮水矢板を打ち込み土中に鋼製の壁を設置




基礎となるコンクリートの土台



### 【プレキャスト函体設置完了】


設置した10基の函体を両側から挟み込むように力をかけ、一体化させ固定しています。

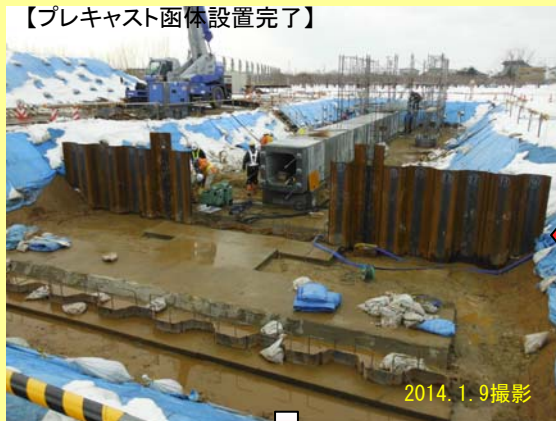

工場で製作したプレキャスト函体を設置



ゴムが挟まっており、隙間が4.5cm程度から2.0cm程度に狭くなっています！

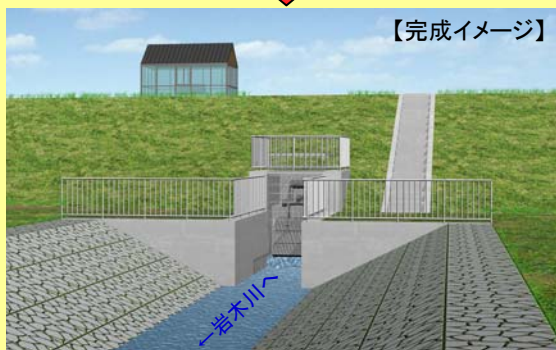

川側の水路の掘削も進んでいます！



**工事に伴い、堤防の道路は通行できません。ご協力をお願いします。**
