


八幡平山系(秋田県側)直轄火山砂防事業 八幡平山系北桧木内川第2砂防えん堤工事 工事広報【7月号】

2023.7.3 発行

発注者 国土交通省東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所

受注者  総合建設業
佐藤建設株式会社

〒014-1201
仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-16
TEL 0187-46-2681(代)

〒014-1201
仙北市田沢湖生保内字武蔵野117-255
TEL 0187-43-1700(代)
FAX 0187-43-3868

砂防出張所
出張所長 大淵 剛志

北桧木内川作業所
現場代理人 大石 克寿
監理技術者 富澤 政道
広報担当者 平川 慎妙子

工事の進捗状況


4月20日から開始しておりました生コン打設作業も天候に恵まれ予定工程通り作業が進んでいます。6月はスリット部の1次コンクリートの打設が完了し、いよいよスリットの建込作業が今月から開始します。スリット建込の際は、スリット置場から現場までの運搬作業があり、大型車両の通行が多くなります。安全には十分気を付けて運搬作業を行ってまいりますのでご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

また、本体コンクリート打設において、現地精査により打設箇所が増えました。当初、6月いっぱい今年度分の施工が完了予定でしたが、8月いっぱいまで本体工の打設を行います。(打設予定日3Dモデル参照)

7月の生コン打設予定日

※3Dモデルによる7月施工予定箇所(着色部)

4日(火曜日) 6日(木曜日) 11日(火曜日)
13日(木曜日) 18日(火曜日) 20日(木曜日)
25日(火曜日) 27日(木曜日)

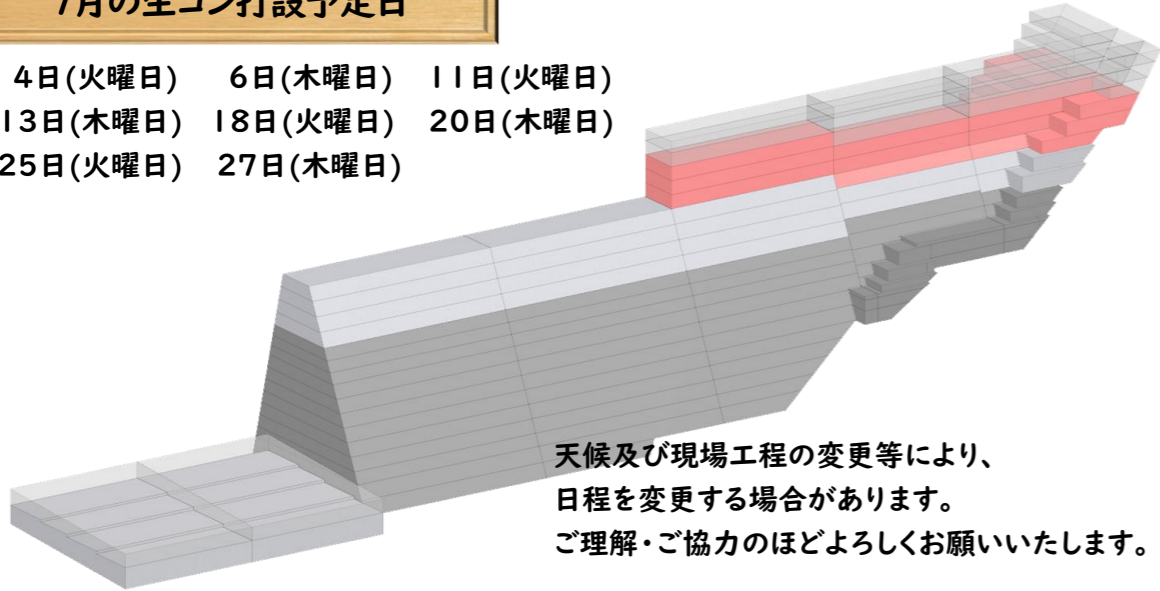

工事工程表

工期:令和5年3月3日~令和5年12月20日

— 計画工程線 — 実施工程線

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
準備工・後片付け	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
砂防土工 (スリット掘削部)		—	—	—	—	—	—	—	—	—
砂防堰堤工	コンクリート堰堤工	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鋼製堰堤工 (鋼製スリット部)		—	—	—	—	—	—	—	—
鋼製スリット工場製作		—	—	—	—	—	—	—	—	—
応急処理工 (濁水処理施設設置)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
仮設工 (ヤード造成・転流等)		—	—	—	—	—	—	—	—	—

救命救急講習を行いました

田沢湖消防署から講師の方に来ていただき、田沢湖公民館にて救命救急講習を行っていただきました。心臓マッサージ・人工呼吸の仕方やAEDの使用方法、食べ物等をのどに詰まらせてしまった際の対処法等を実演を交えながら講習していただきました。緊急時の対応や処置の行い方を詳しく学ぶことができました。



今年も開催『はたらくるま見学会』

6月23日(金)に、だしのご園の園児たちをお招きし、当社の駐車場で『はたらくるま見学会』を開催しました。当日は雨予報でしたが小雨で雨が上がる場面もあり、無事に開催することができました。いろいろな種類の重機の試乗や操作を体験した、園児たちの喜ぶ表情にとっても癒された1日でした。7月中には会社のフェンスに子供たちの塗り絵を掲示します。是非ご覧ください。

