


八幡平山系(秋田県側)直轄火山砂防事業
八幡平山系北桧木内川第2砂防えん堤工事
 工事広報【8月号】 2023.8.1 発行

発注者 国土交通省東北地方整備局 湯沢河川国道事務所
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所
 受注者  **総合建設業 佐藤建設株式会社**

〒014-1201
 仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-16
 TEL 0187-46-2681(代)
 〒014-1201
 仙北市田沢湖生保内字武蔵野117-255
 TEL 0187-43-1700(代)
 FAX 0187-43-3868

砂防出張所
 出張所長 大淵 剛志
 北桧木内川作業所
 現場代理人 大石 克寿
 監理技術者 富澤 政道
 広報担当者 平川 慎妙子

スリット2基目組立完了



スリット組立状況
 R5.7.24撮影

工事の進捗状況

7月は、秋田県内の記録的大雨に見舞われましたが、現場では幸いにも大雨の影響による被害がありませんでした。降雨により生コン打設の工程に多少の遅れはあるものの順調に作業が進められています。
 さて、現場はスリット施工箇所の足場組立を行いながら2基分のスリット組立と、左岸側本体部の生コン打設を同時進行で施工していきます。
 7月中にスリットの組立作業を完了して現在、塗装作業を行っております。本体コンクリート打設に関しては、8月いっぱい打設終了となる予定です。生コン車も引き続き、通行いたしますので安全には十分気を付けて運搬作業を行います。今後ともご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。

7月下旬より、連日暑い日が続いており現場でも、熱中症対策を行いながら作業しております。皆様も熱中症に注意してこの夏を乗り切りましょう。



1基目組立完了



2基目組立状況

出張所管内安全対策協議会パトロー

7月19日に秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内安全対策協議会による現場パトロールが行われました。
 7月の現場パトロールは当現場が点検対象現場となりました。他社の方に現場を見ていただく機会はなかなかないので、パトロール時にいただいた指摘等は改善を行い、より安全に施工を行っていきけるようにしていきます。



R5.7.19撮影

だしのこ掲示板を設置しました



先月号でお知らせした働く車見学会の一環として、園児の皆さんに建設機械のぬり絵をしていただきました。塗ってくれたぬり絵は、本社駐車場のフェンス及び現場事務所道路わきにも掲示しました。近くを通り際は、色とりどりのぬり絵をぜひご覧ください。みんな、とても上手に塗れています！



現場事務所

湯沢河川国道事務所事故防止対策委員会総会

7月27日に湯沢河川国道事務所事故防止対策委員会総会が行われました。総会では工事事故発生状況や前年度の事業経過報告や安全パトロールの結果報告と今年度の事業計画の決定がありました。また、受注者代表の安全決意宣言を当工事の現場代理人の大石が行いました。

令和5年度 湯沢河川国道事務所 事故防止目標
 『死亡事故ゼロ！』

作業手順の遵守を徹底し、
 労働災害・物損公衆災害を未然に防止！



R5.7.27撮影

工事工程表

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
準備工・後片付け	■	■								
砂防土工 (スリット掘削部)			■	■						
砂防堰堤工 コンクリート堰堤工			■	■	■	■	■	■	■	■
鋼製堰堤工 (鋼製スリット部)			■	■	■	■	■	■	■	■
鋼製スリット工場製作			■	■	■	■	■	■	■	■
応急処理工 (濁水処理施設設置)			■	■	■	■	■	■	■	■
仮設工 (ヤード造成・転流等)			■	■	■	■	■	■	■	■


工期:令和5年3月3日~令和5年12月20日

■ 計画工程線 ■ 実施工程線

8月の生コン打設予定日

1日(火曜日) 3日(木曜日) 8日(火曜日)
 10日(木曜日) 17日(木曜日) 22日(火曜日)
 24日(木曜日) 29日(火曜日) 31日(木曜日)

※3Dモデルによる8月施工予定箇所(着色部)

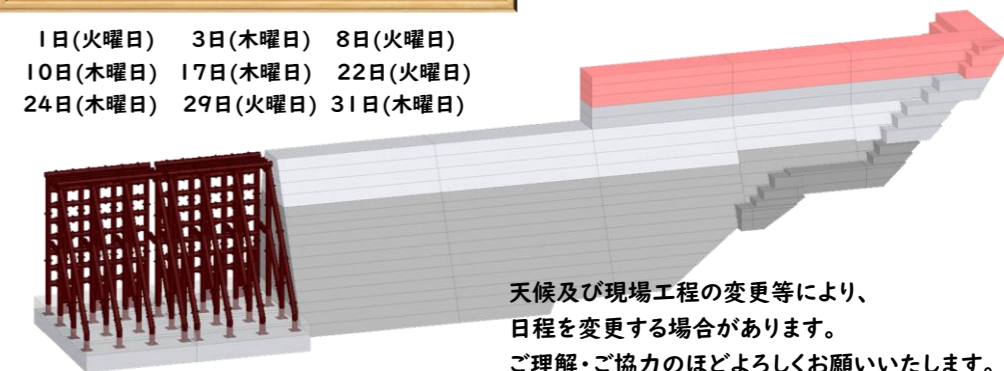

天候及び現場工程の変更等により、日程を変更する場合があります。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
