



ゆ ぎ さ か た

遊佐象潟通信

発行:本荘地区監督官室
 問合せ:TEL 0184-23-4081
 令和2年9月25日発行
 【第5号】

市の沢川橋(仮称)の上部工をつくっています

先月に引き続き、ご紹介させていただきます。
 今月はおもに橋桁の組立架設の状況報告となります。

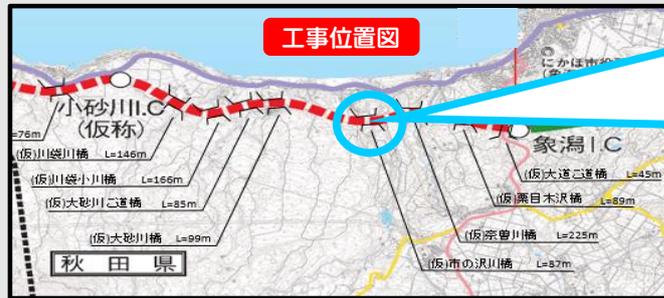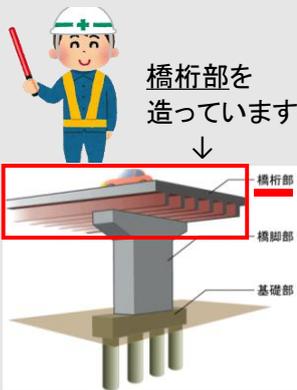

【工事名】
 日本海沿岸東北自動車道
 市の沢川橋上部工工事

【施工】
 株式会社 安部日鋼工業

【工事場所】
 にかほ市象潟町西中野沢字
 山ノ神 地内

足場工・主桁組立架設状況

① 橋脚廻りに足場を組みます



② 防護ネットを張ります



③ 架設桁を架けます



④ 所定の位置に架設します



⑤ 架設桁まで移動して吊り上げます



⑥ 桁下のゴム支承をすえます



完成予想図



現場担当者より

橋桁は「PCコンポ橋」です。
 PCコンポ橋とは、工場で橋桁を運搬
 できる大きさに製作し、現場で組み
 立てて一つの橋桁にする橋のことで
 す。



9月に入り、順調に現場の桁架設が開始しました。工場製作した主桁とPC板を並べ、10月の中旬には3径間の87mが一応、繋がることとなります。このあとは床版工・壁高欄工など、橋面工事を行い、みなさんが走れる道路橋へとなっていきます。引き続き、生コン車などの工事車両が頻繁に出入りしますので、地域の皆様には大変ご迷惑をおかけします。現場での安全対策に留意し、ひとつの事故もなく来年3月の完成を目指します。今後とも皆様のご理解とご協力をお願いします。
