

# 十三湖右岸圍繞堤土佐地区外修繕工事

十三湖 土佐地区

2013. 12. 5

## 法留基礎 かさ上げコンクリートの打設完了！



### 【工事概要】


- 工事箇所 : [十三土佐地区] 五所川原市十三 地内 (十三湖右岸 2.0~2.2K)  
 [柏地区] つがる市柏桑野木田 地内 (岩木川左岸 33.3K)
- 工期 : 平成25年8月3日 ~ 平成26年3月 (予定)
- 施工業者 : ㈱江良組
- 工事内容 : [十三土佐地区] 十三湖からの越波被害を防ぐため、堤防を高くします。  
 [柏地区] 堤内 (堤防で守られている側) からの排水能力を向上させるための水路を造ります。

### ○十三土佐地区

堤防の高さを確保するためコンクリートによる壁を追加設置するとともに、護岸に大型連節ブロックを設置し、堤防としての機能を強化します。



標準横断図 (十三土佐地区) S=1:50

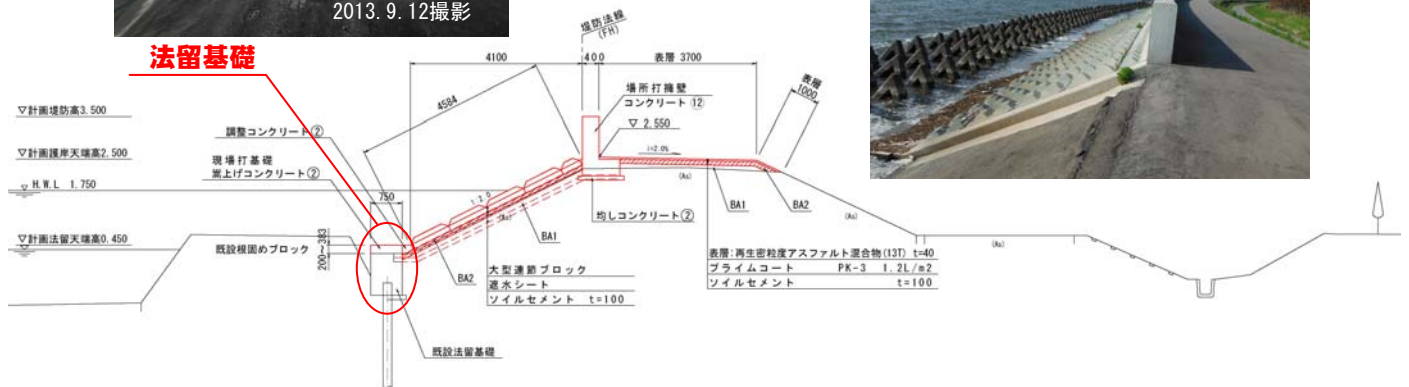

## 《進捗情報 H25. 12. 4現在》

### ○十三土佐地区

#### ▼ 法留基礎 かさ上げコンクリートの打設完了！



#### ▼ 現在、堤防斜面の盛土と整形を進めています！



▲ バックホウで土を貼り付けながら斜面の形を整え、特殊な機械を取付け締め固めをしています。

### <トピックス>

この現場では、風等の影響により十三湖の水位が上昇し、幾度となく現場が浸水してしまうというアクシデントに見舞われています。



そのたびに、仮設鋼矢板の隙間に間詰めをするなど対処し、工事を行っています。

これから、ますます気象条件が厳しくなりますが、安全第一を心がけ、早期完成を目指します。
