

踏切道安全通行カルテ

更新日：令和4年12月末

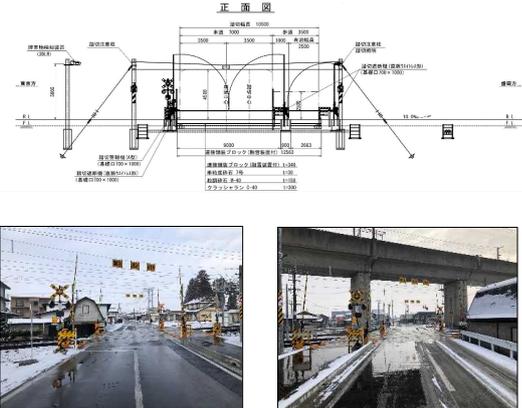
| | | | | | |
|------|-------|-------|---------------------------|--------|---------|
| よみがな | みなみやば | 所在地 | 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第12地割107番地2 | | |
| 踏切道名 | 南矢巾 | 道路名 | 町道田中縦道線 | 道路管理者名 | 矢巾町 |
| | | 鉄道路線名 | 東北線 | 鉄道事業者名 | 東日本旅客鉄道 |

| 位置図・現況写真 | | 諸元・構造等 | | | | | R3年9月末時点 | |
|---|------------------|----------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-----------|--|
|  <p>(現況)</p> | 踏切種別 | 第1種 | 幅員 (m) | 位置 | 歩道部 (起点寄) | 車道 | 歩道部 (終点寄) | |
| | 踏切長(m) | 11.7 | | 左道路 | 1.0 | 5.5 | 1.0 | |
| | 横断本数(本) | 2 | | 踏切道 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | |
| | 交差角(度) | 60 | 右道路 | 1.0 | 5.5 | 1.0 | | |
| | 道路線形 | 左道路 | 直線 | 迂回路 | 種類 | 有無等 | 距離(m) | |
| | | 右道路 | 直線 | | 自動車 | 両方共なし | - | |
| | 交通規制 | 交通規制なし | | | 歩行者 | 迂回路なし (200m以内) | - | |
| | 車両進入防護柵等 | 設置していない | | | バリアリ化 | 迂回路なし (200m以内) | - | |
| | 歩車道分離方法 | なし | | バリアリ化状況 | - | DID地区 | - | |
| | 踏切保安設備 | 賢い踏切 | - | | 踏切支障報知装置(手動) | ○ | | |
| 高規格保安設備 | | 障害物検知装置(3次元レーザーレーダ式) | | 高齢者等の事故防止対策設備 | - | | | |
| 特性 | 通学路指定状況 (学校指定) | ○ | | 通学路交通安全プログラム | ○ | | | |
| | バリアフリー法に基づく特定道路上 | - | | 緊急輸送道路上重要物流道路上 | - | | | |
| 自動車交通量 (台/日) | 5,077 | | 歩行者等交通量 (人/日) | 633 | 鉄道交通量 (本/日) | 117 | | |

| 基準算定データ | | | | | | | R3年9月末時点 | | |
|---------------------|--------|--------------|--------|------------|--------|----|----------|------|---|
| ピーク時遮断時間(分) | 16 | 前後歩道との幅員差(m) | -1.0 | 踏切内の事故発生状況 | 事故別 | 件数 | 死者数 | 地域課題 | - |
| A. 踏切自動車交通遮断量(台・時) | 17,769 | AとBの和 | 19,984 | | 踏切事故 | 0 | 0 | | |
| B. 踏切歩行者等交通遮断量(人・時) | 2,215 | | | | 道路交通事故 | 0 | 0 | | |

| カルテ踏切の基準 | | | | | | | R3年9月末時点 | |
|----------|-------------|-------------|--------|----------|--------|-------------|----------|--|
| 開かずの踏切 | 自動車ボトルネック踏切 | 歩行者ボトルネック踏切 | 歩道狭径踏切 | 通学路要対策踏切 | 事故多発踏切 | 移動等円滑化要対策踏切 | | |
| - | - | - | - | ○ | - | - | | |

| 法指定の状況 | | | | | R4年12月末時点 | |
|---------------|------------------------|---|---|---|-----------|---|
| 法指定年月日 | 指定に係る基準 (踏切道改良促進法施行規則) | | | | | |
| H29.1.27 (旧法) | 第2条第8号 (通学路要対策踏切) | - | - | - | - | - |

| 対策図・完了写真 | | 対策実施の状況 | | | | | R4年12月末時点 | |
|---|------------|----------|------------|-------|--------|--|-----------|--|
|  | 進捗 | 協議会の設置状況 | 改良計画書の作成年度 | 事業化年度 | 工事着手年度 | | | |
| | 対策完了 | ○ | R1 | H30 | R3 | | | |
| | 対策内容 | | | | | | | |
| | ・踏切拡幅 (R4) | | | | | | | |
| | 事業完了年度 | 対策の効果等 | | | | | | |
| R4 | | | | | | | | |
| 除却年度 | - | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
