

気仙沼港IC～大島IC(No. 95～No. 170) 工事進捗状況


R1年10月下旬時点

〔凡例〕

- 橋梁・こ道橋
- トンネル
- 道路函渠
- 水路函渠
- 完成

《工事の種類》

- 改良: 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例: ○○改良工事・○○道路改良工事
- 橋梁: 車が通行する橋梁をつくる工事
例: ○○下部工工事・○○上部工工事
- 函渠: 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例: ○○トンネル工事
- トンネル: 車が通行するトンネルをつくる工事
例: ○○トンネル工事
- 道路: 改良・橋梁・函渠・トンネル工事を行う工事
例: ○○道路工事
- 舗装: 道路の舗装を行う工事
例: ○○舗装工事

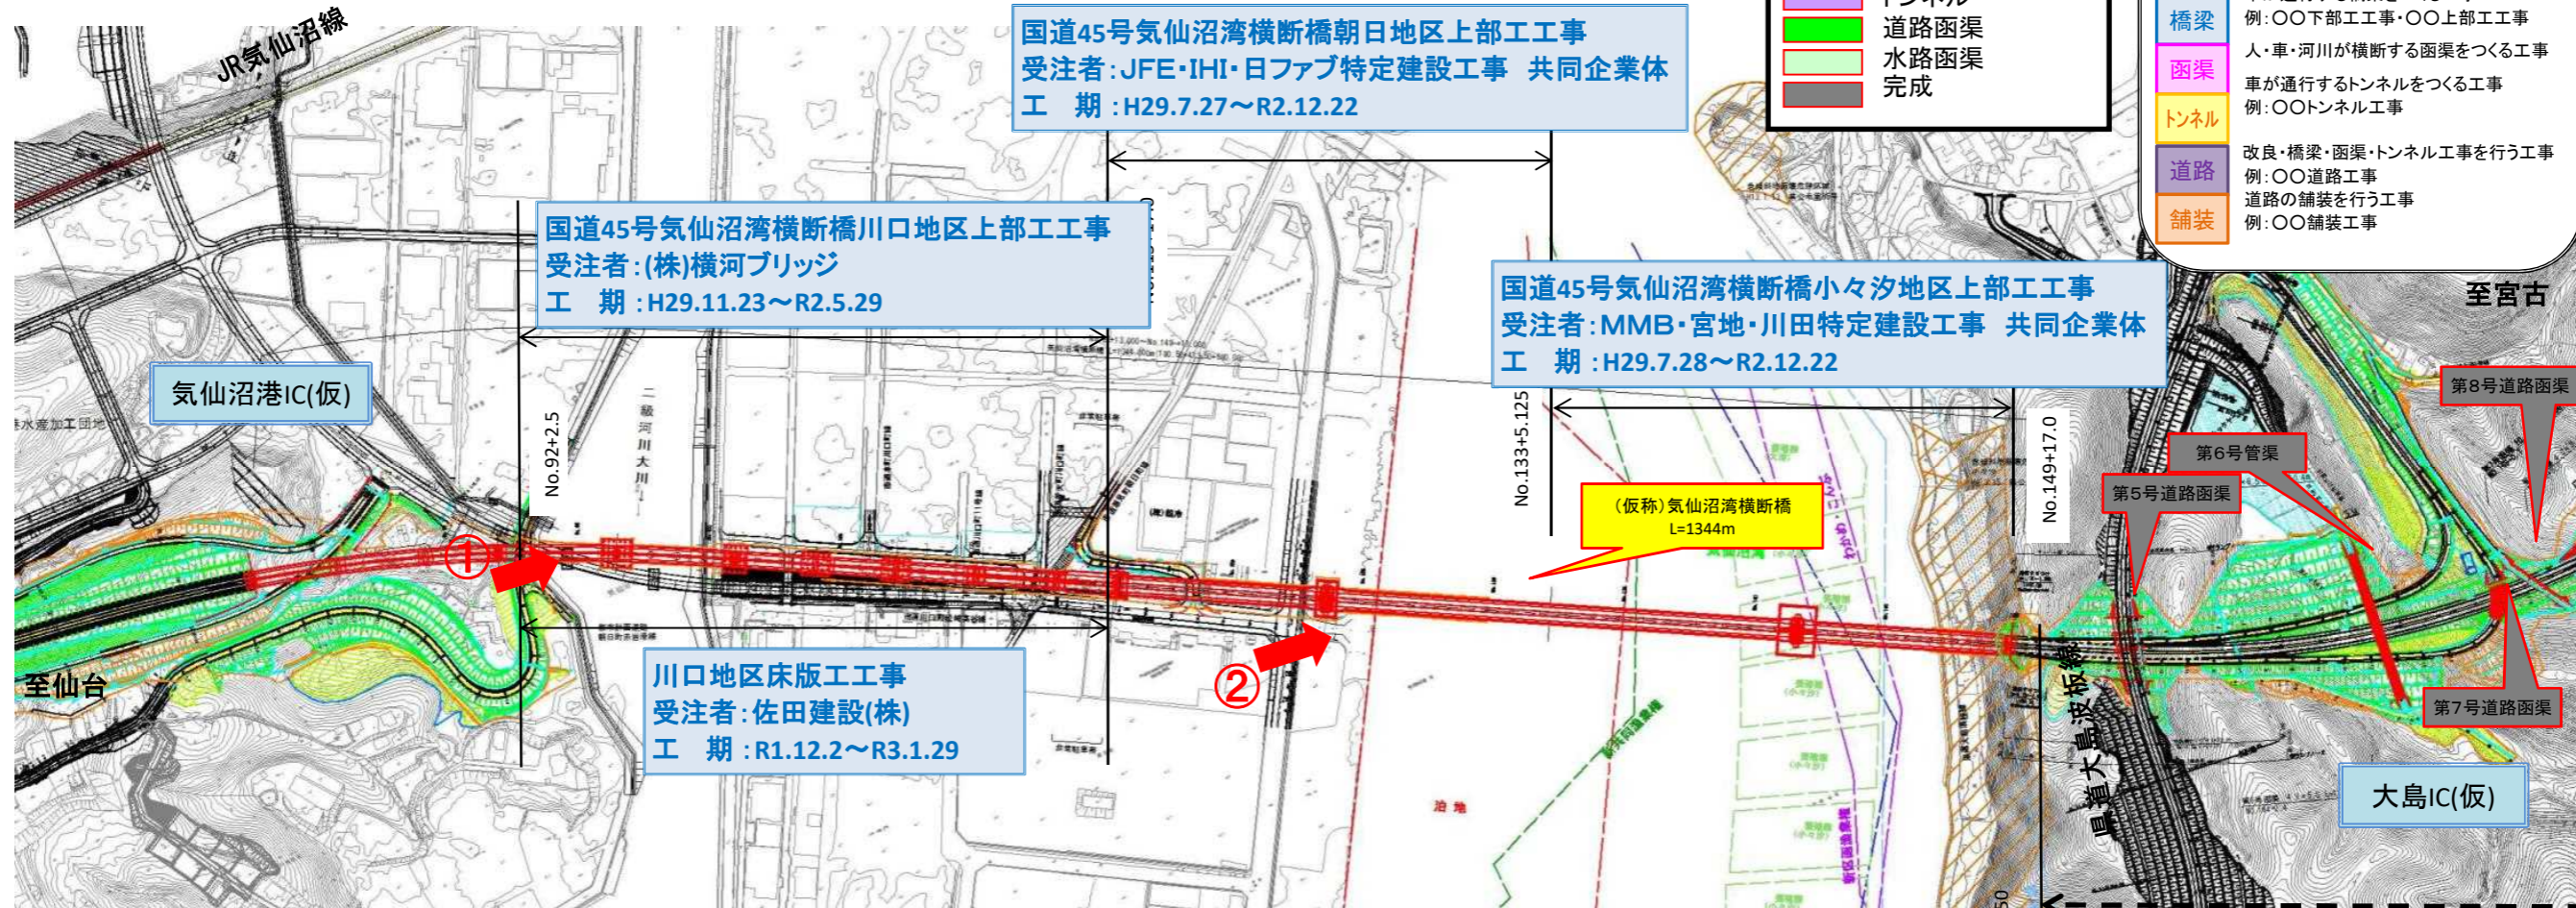

国道45号気仙沼湾横断橋朝日地区上部工工事
受注者: JFE・IHI・日ファブ特定建設工事 共同企業体
工期: H29.7.27～R2.12.22

国道45号気仙沼湾横断橋川口地区上部工工事
受注者: (株)横河ブリッジ
工期: H29.11.23～R2.5.29

国道45号気仙沼湾横断橋小々汐地区上部工工事
受注者: MMB・宮地・川田特定建設工事 共同企業体
工期: H29.7.28～R2.12.22

川口地区床版工工事
受注者: 佐田建設(株)
工期: R1.12.2～R3.1.29

(仮称)気仙沼湾横断橋
L=1344m

国道45号気仙沼地区道路工事
受注者: 三井住友建設(株)
工期: H30.3.14～R2.3.13

① 橋梁



▲No.90付近から終点側を望む
〔(仮)気仙沼湾横断橋 P4～P12〕

② 橋梁



▲No.122付近から終点側を望む
〔(仮)気仙沼湾横断橋 P11～A2〕

