

南三陸道路[志津川IC～歌津IC](No.0～No.176)工事進捗状況

< 志津川IC～歌津ICの延長7.2kmを2車線事業中 >

H26年7月上旬時点

- 《工事の種類》
- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
 - 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工事・〇〇上部工事
 - 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
 - トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事



①
1号トンネル

平井田地区道路改良工事
受注者：日建工業(株)
工期：H25.10.8～H26.12.25


新井田川橋上部工工事
受注者：(株)安部日鋼工業
工期：H25.3.16～H26.8.8

新井田川橋：橋台2基 橋脚2基

国道45号 磯の沢地区トンネル工事
受注者：(株)奥村組
工期：H25.11.16～H26.12.12

志津川IC橋上部工工事
受注者：日本鉄塔工業(株)
工期：H26.3.8～H27.1.30

南三陸道路1号トンネル工事
受注者：前田建設工業(株)
工期：H25.3.14～H26.7.18

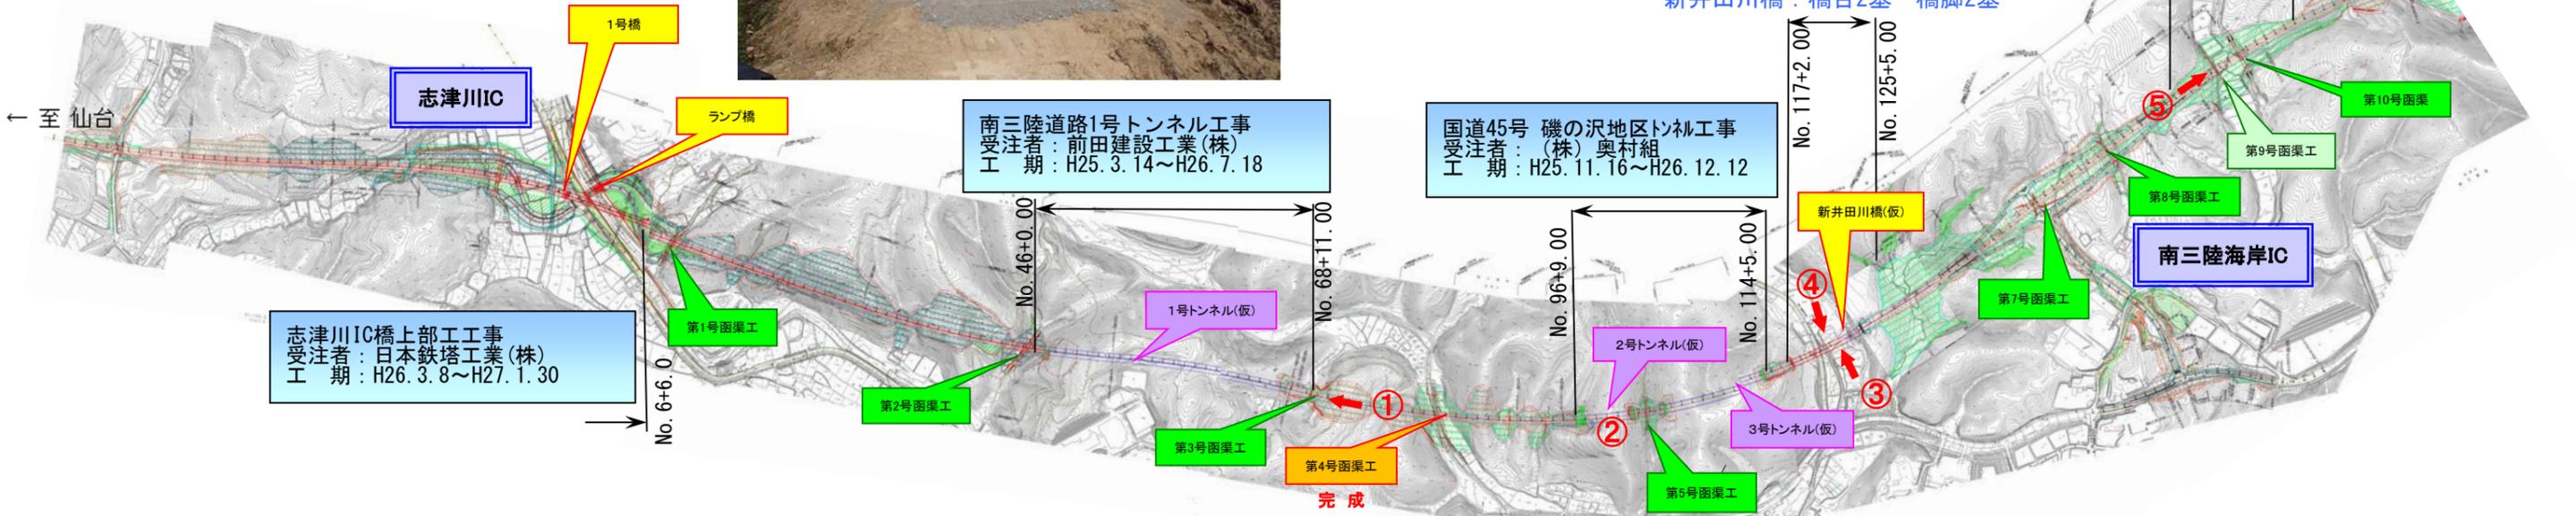

- 〔凡例〕
- 橋梁・公道橋
 - トンネル
 - 道路函渠
 - 水路函渠

②
2号トンネル

③
国道45号から橋梁右側を望む
新井田川橋

④
県道206号からP1を望む
新井田川橋

⑤
No.160から終点側を望む



フォアボーリング
施工状況

