

南三陸道路[志津川IC～歌津IC](No.176～No.355) 工事進捗状況

H28年1月上旬時点

< 志津川IC～歌津ICの延長7.2kmを2車線事業中 >

国道45号 南三陸地区道路改良工事
受注者：(株)不動テトラ
工期：H26.10.15～H28.3.18


大上坊地区道路改良工事
受注者：千田建設(株)
工期：H27.5.1～H28.3.30

国道45号 大上坊川橋上部工工事
受注者：(株)安部日鋼工業
工期：H27.3.17～H28.7.30

蛇王地区道路改良工事
受注者：(株)佐藤工務店
工期：H27.4.1～H28.2.29

南三陸道路トンネル舗装工事
受注者：世紀東急工業(株)
工期：H27.5.1～H28.3.25

- [凡例]
- 橋梁・公道橋(計画)
 - トンネル(計画)
 - 道路函渠(計画)
 - 水路函渠(計画)
 - 完成・一部完成

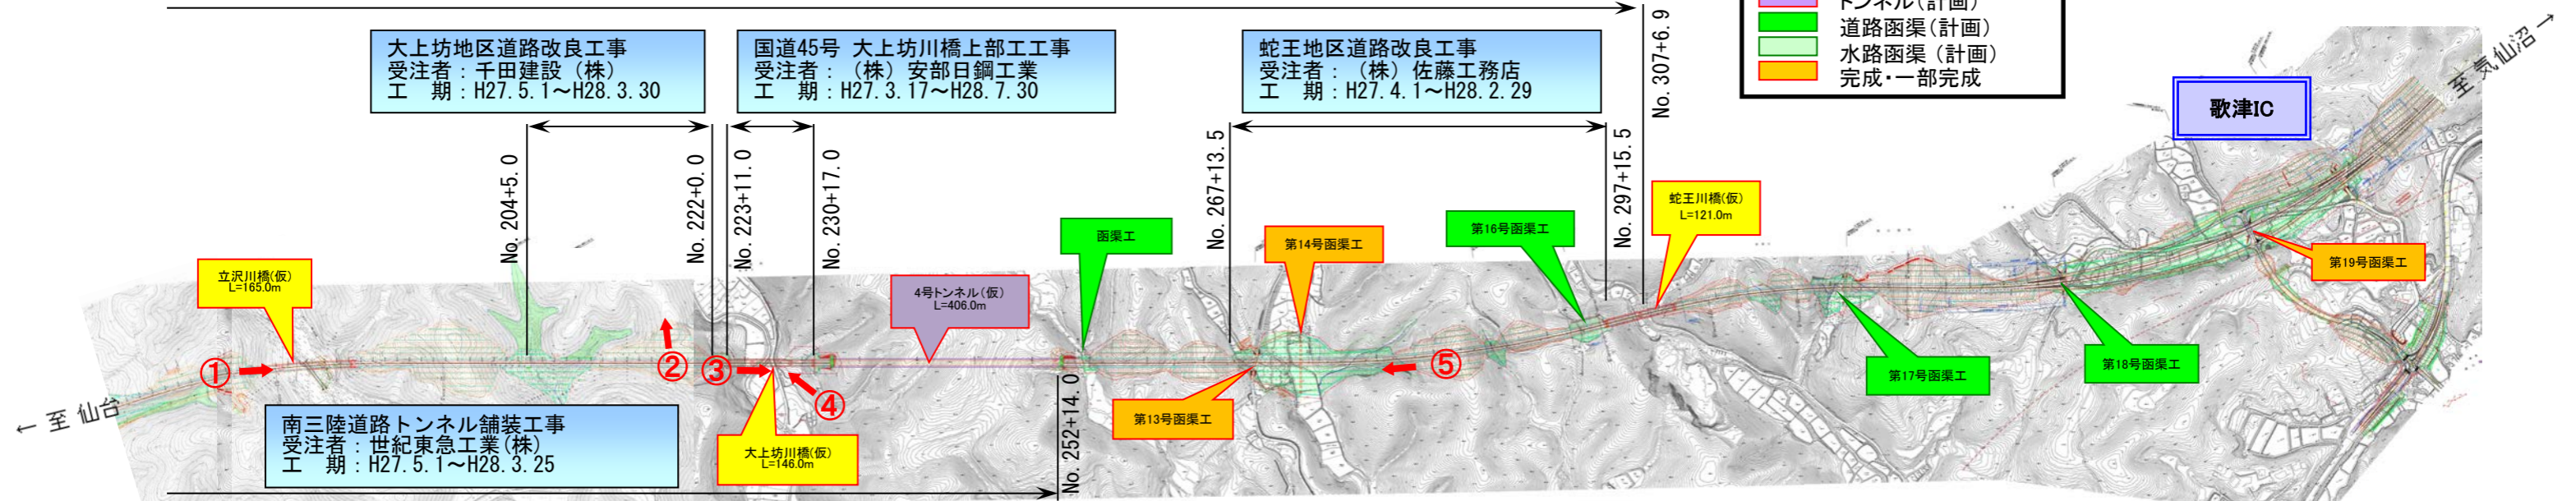

- 《工事の種類》
- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：〇〇改良工事・〇〇道路改良工事
 - 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：〇〇下部工工事・〇〇上部工工事
 - 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：〇〇函渠工事・〇〇構造物工事
 - トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：〇〇トンネル工事

