


南三陸道路[志津川IC～歌津IC](No.176～No.355) 工事進捗状況

< 志津川IC～歌津ICの延長7.2kmを2車線事業中 >

H28年10月上旬時点

平井田地区道路改良工事
受注者：(株)吉田組
工期：H28. 8. 4～H29. 3. 28

阿曾地区道路改良工事
受注者：(株)ピーエス三菱
工期：H28. 9. 13～H29. 3. 24

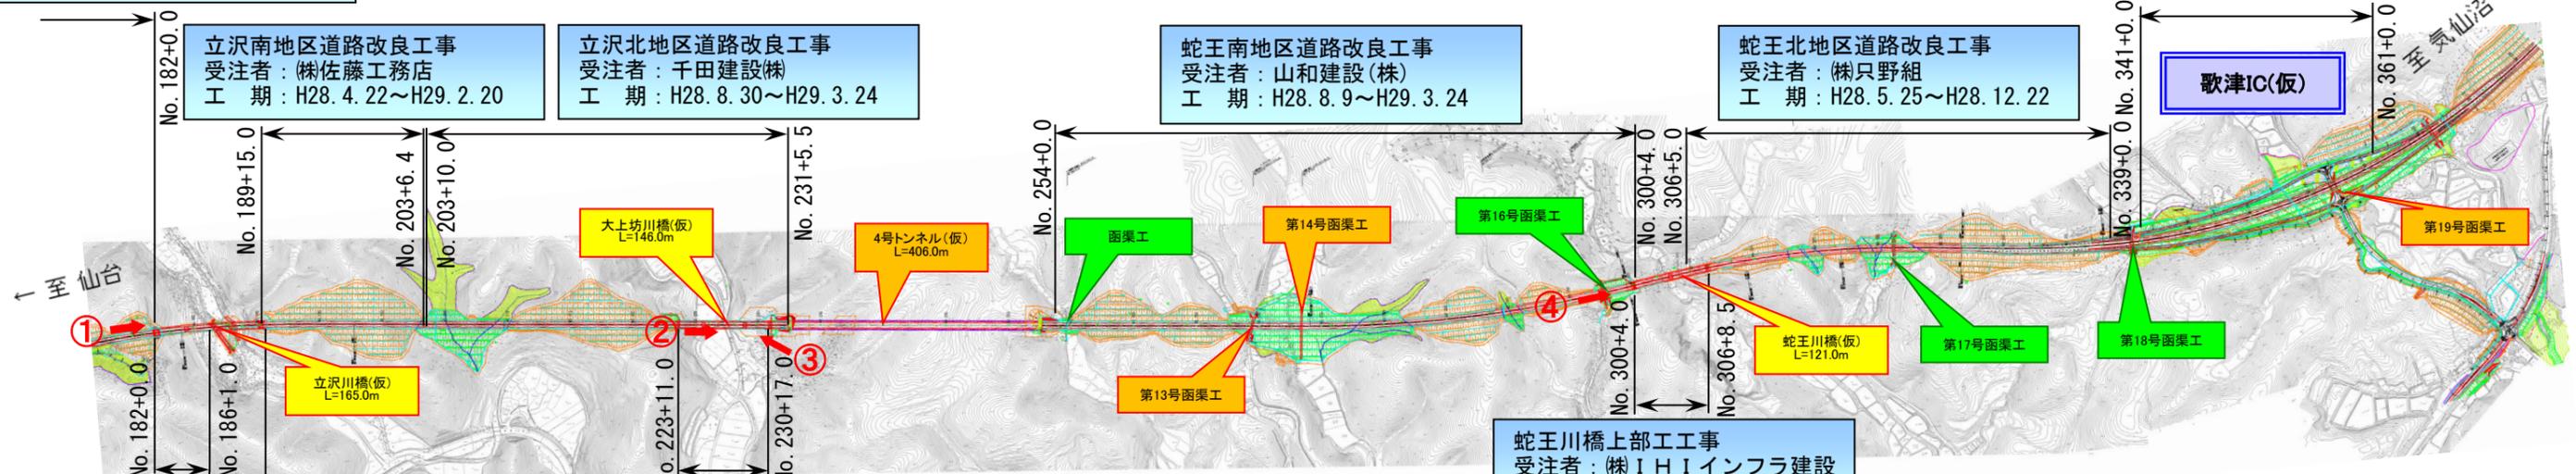

立沢南地区上部工工事
受注者：(株)安部日鋼工業
工期：H28. 6. 8～H29. 3. 10

国道45号 大上坊川橋上部工工事
受注者：(株)安部日鋼工業
工期：H27. 3. 17～H28. 10. 31

蛇王川橋上部工工事
受注者：(株)IHIインフラ建設
工期：H28. 6. 1～H29. 3. 10

立沢北地区上部工工事
受注者：オリエンタル白石(株)
工期：H28. 6. 17～H29. 3. 21



② A1側からA2側を望む
((仮)大上坊川橋上部工)



④ 起点側から終点側を望む
((仮)蛇王川橋下部工)



① A1側からP2側を望む
((仮)立沢川橋下部工)



③ 右側からP1、P2を望む
((仮)大上坊川橋上部工)

- 《工事の種類》
- 改良** 盛土・切土・排水・地盤改良を主に行う工事
例：○○改良工事・○○道路改良工事
 - 橋梁** 車が通行する橋梁をつくる工事
例：○○下部工工事・○○上部工工事
 - 函渠** 人・車・河川が横断する函渠をつくる工事
例：○○函渠工事・○○構造物工事
 - トンネル** 車が通行するトンネルをつくる工事
例：○○トンネル工事
 - 舗装** 舗装・路盤・排水・路床盛土を主に行う工事
例：○○舗装工事

- 〔凡例〕
- 橋梁・こ道橋 (計画)
 - トンネル (計画)
 - 道路函渠 (計画)
 - 水路函渠 (計画)
 - 完成・一部完成
