

両羽地区橋梁補修工事の紹介

令和2年4月から、国道7号の両羽横断歩道橋の補修を行って
おりましたが、このたび歩道橋が完成したので紹介いたします。



《工事内容》（両羽横断歩道橋）

- ・既設橋桁の撤去
- ・新設橋桁の製作、架設
- ・下部工の補修（塗り替えなど）



▲ 老朽化した歩道橋を撤去している様子
(R2.8撮影)

撤去の際には75 t吊の
クレーンを2台使用して
撤去作業を行いました。

撤去した橋桁は現地で
2つに切断され、現場
より搬出されました。



▲ 両羽横断歩道橋 (R2.3撮影)



▲ 運搬するために橋桁を切断して
いる様子



▲ 橋桁の運搬の様子

昭和53年 新設
平成13年 塗装塗り替え
令和2年 老朽化の為、架け替え


工事時点で42年が経過しており、
橋脚のみ既設を再利用し、その他は
全て新しいものに交換します。



設置の際には
100 t吊の
クレーンを使用
しました。

▲ 新しい橋桁を架設している様子 (R2.10撮影)

完成した両羽横断歩道橋 (R2.12撮影)

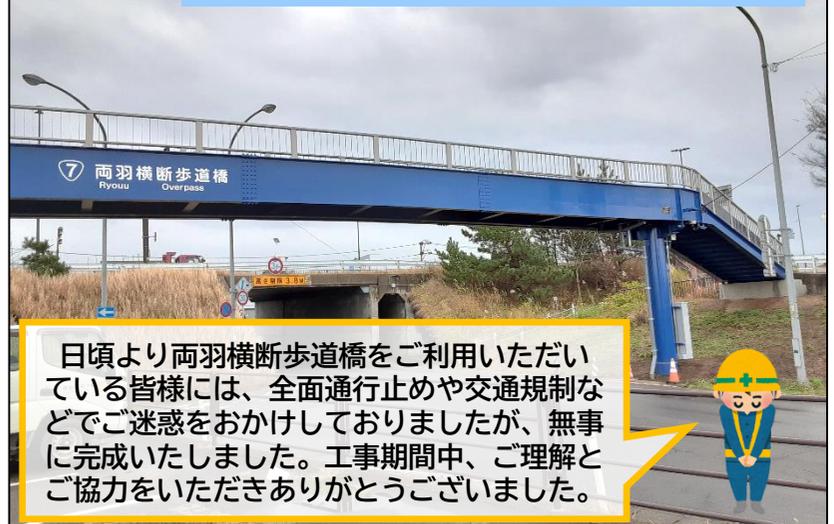

日頃より両羽横断歩道橋をご利用いただ
いている皆様には、全面通行止めや交通規制な
どでご迷惑をおかけしておりましたが、無事
に完成いたしました。工事期間中、ご理解と
ご協力をいただきありがとうございました。



国道7号 酒田市・遊佐町、47号 酒田市・庄内町に関するお問い合わせは、
国土交通省 酒田国道維持出張所 までお願いします。

住所：酒田市豊里字南沼田ノ上11-3

TEL：0234-34-2331

ホームページURL：<http://www.thr.mlit.go.jp/sakata/>

令和3年1月13日発行
国土交通省東北地方整備局
酒田河川国道事務所
酒田国道維持出張所

