

平成24年3月15日発行



米沢国道維持  
出張所通信

# 今泉地区交差点改良工事


昨年3月から、長井市今泉で工事を行っていた「今泉地区交差点改良工事」が無事完成しました。長期間の片側交互通行にご協力いただきましてありがとうございました。

工期：H23. 3. 3～H24. 1. 19

場所：一般国道113号（長井市今泉）

請負業者：小国開発株式会社

内容：交差点の渋滞緩和のための  
道路拡幅・舗装工事

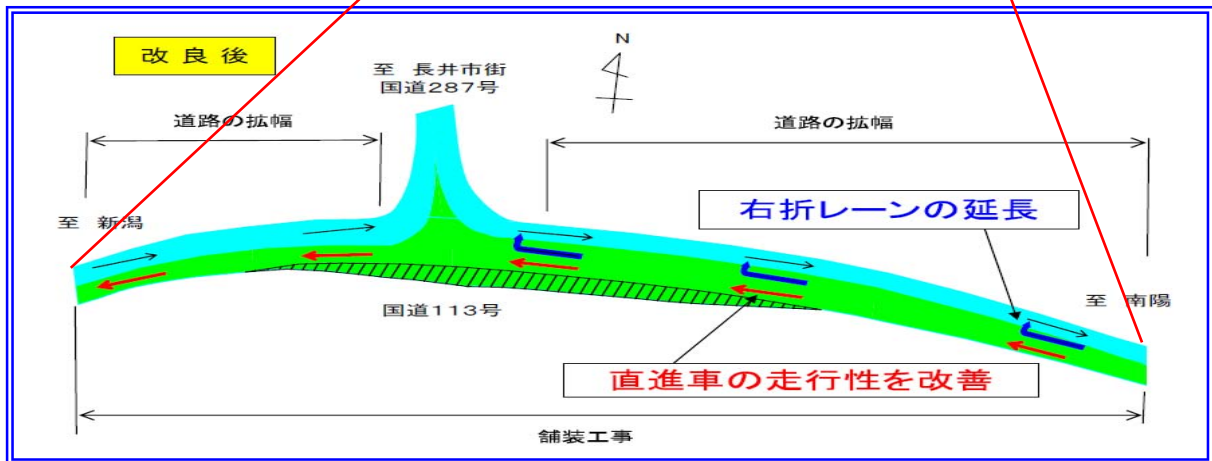

①道路の拡幅：北側に道路を拡幅するために、現在のブロック積みを取り壊し、再度新しくブロック積みを施工しました。



施工前

↑北側へ最大4.2m拡幅しました。

## コンクリートフレーカー




ブロック積を壊すために  
使用しました。→






↑法面の状態(クラック等)  
がいつでも確認できるように、  
厚手の透明シートで養生しました。



←ブロックは、職人さんが1  
つつ手積みしました。  
延長：93m  
ブロック数：2300個



**②右折レーンの延長**：右折レーンを50m→120mと長くすることにより、直進車は右折車の列に巻き込まれずに走行できるようになり、交差点の渋滞が緩和されます。

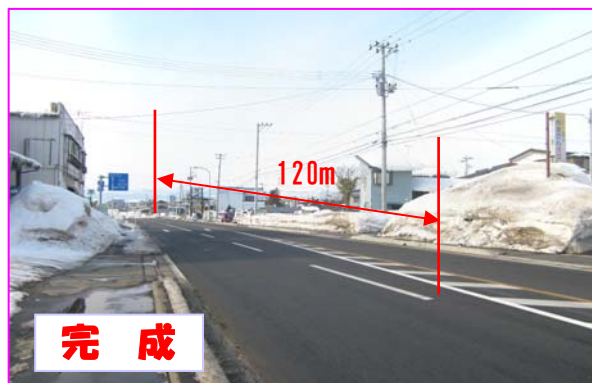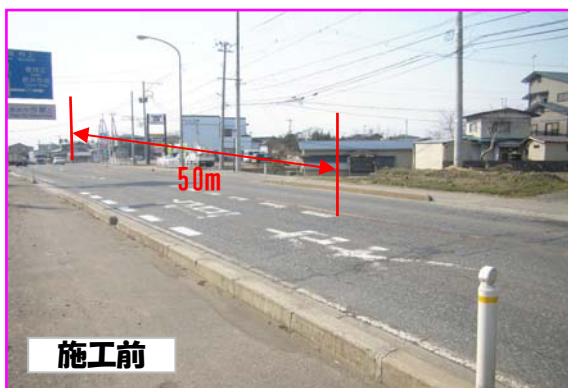

**③安全対策**：現道工事のため、通行する車両や歩行者に対し様々な安全対策を行いました。



←歩行者が見やすい注意喚起看板の設置

作業帯への立ち入り防止柵の設置→



現場代理人：安城さん

本工事は、供用している箇所であり、地域住民や歩行者の方へ明るい挨拶を心掛けて工事を進めてきました。日々の交通規制を伴う作業においては、交差点での事故が多いことから、見やすい工事看板の設置と交通誘導員の配置位置に気を配りました。降雪の影響で舗装工事ができず長引いてしまいましたが、この度、無事に工事を完成する事ができました。地域住民の皆様をはじめ、道路を通行されます皆様には、長期にわたり工事に対して、ご理解ご協力を頂き感謝申し上げます。

～国道13号・113号を維持管理しています～

ご意見・お問い合わせは

国土交通省 山形河川国道事務所  
米沢国道維持出張所

〒992-0011 米沢市中田町260-2  
TEL0238-37-5300 FAX0238-37-5303



お気軽に  
お電話  
ください!

