東北中央自動車道（福島～米沢北間）工事状況

平成27年11月末現在

米沢～米沢北　延長　L＝9．0km

福島～米沢　延長　L＝28km

山形側　延長　L＝11km

福島側　延長　L＝17km

H29年度開通目標　L＝9．0km

H29年度開通目標　L＝26．1km

H28年度開通目標　L＝1．9km

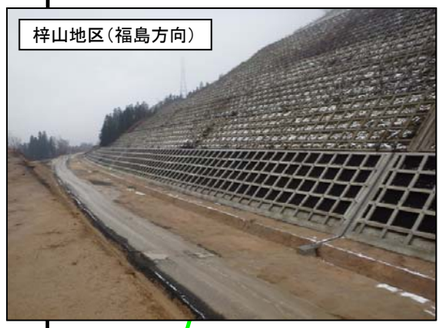

トンネル延長：2，609m
掘削延長　：2,609m（100%）
二次吹付延長　：2,609m（100%）

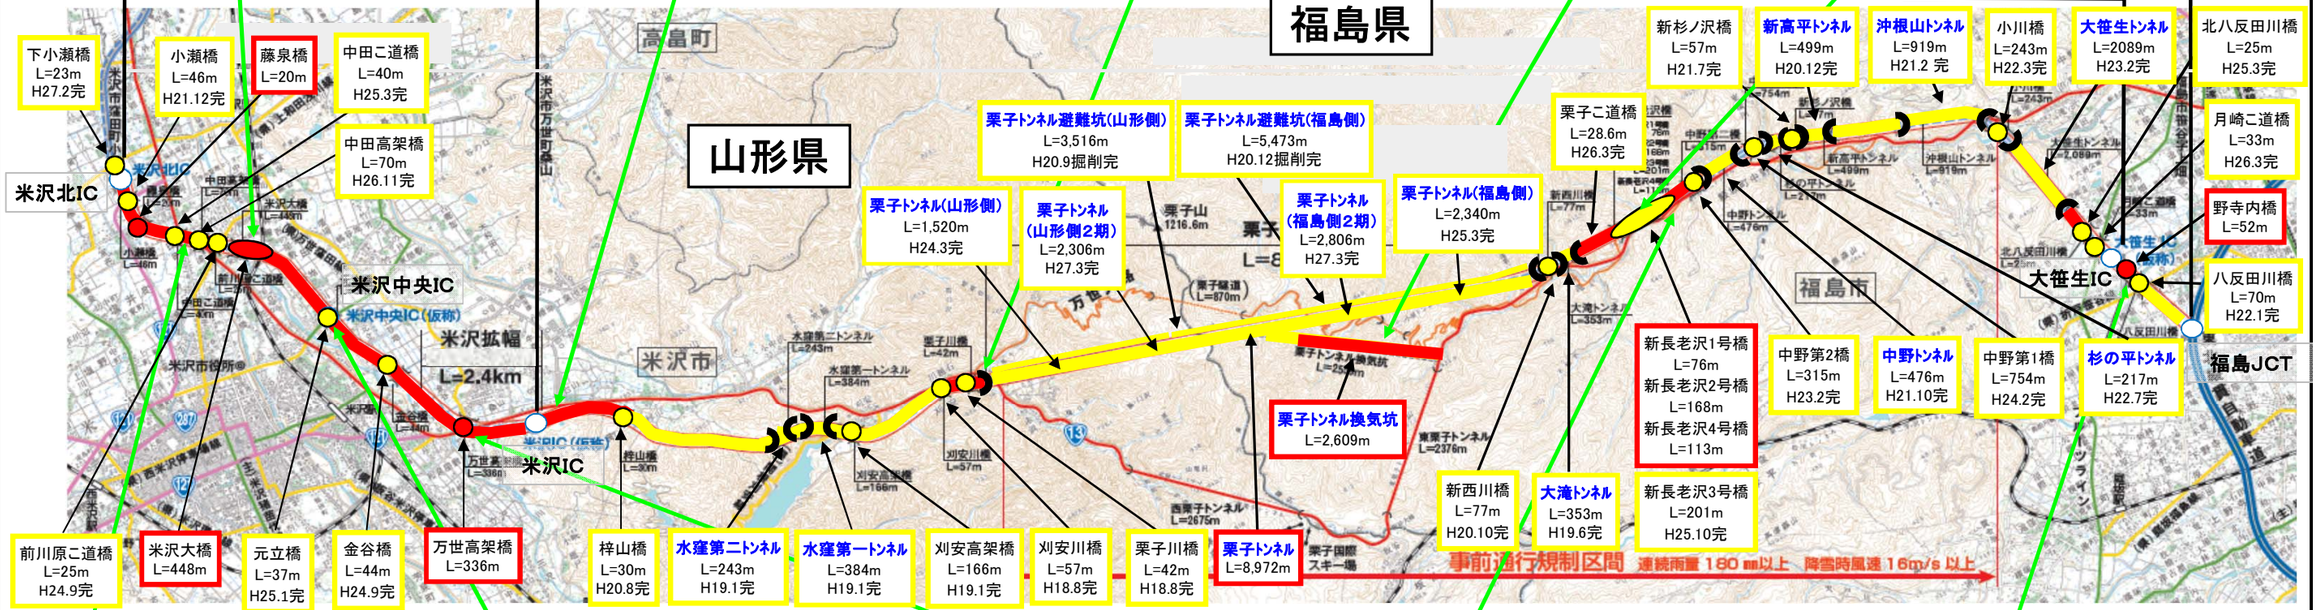

竣工済み　施工中　トンネル：青字
